

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MOZZECANE

Via C.B. Brenzoni n. 26

7060 - MOZZECANE (Verona)

A. A. Modenini

N. 1907 di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CUP I88E18000210006 - CIG 9300614578. INVESTIMENTO PNRR: M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 – PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di ottobre nella Residenza Municipale di Mozzecane, avanti a me Dott. Luciano Gobbi, Segretario Comunale, abilitato a ricevere gli atti di cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., domiciliato per la carica presso il Comune di Mozzecane, via Caterina Bon Brenzoni n. 26, sono presenti:

- a) Arch. Lisa Modenini, nato a Isola della Scala il 25.08.1982 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mozzecane, codice fiscale e partita IVA 00354500233, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, ai sensi e per gli effetti del decreto sindacale prot.n.5714 del 30.06.2022 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione appaltante",
- b) Arch. Elena Rionda, nata a Torino il 12.04.1977 residente a La Cassa -TO-, Via Givoletto n.26, che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante della Società Settanta7 S.r.l. con sede in Torino, Corso Re Umberto n.13 – p. IVA 12396810017, la quale costituisce la mandataria del

SETTANTA7 S.R.L.
Corso Umberto 13 - 10121 Torino
Amministrazione (settanta7.com)
Settanta7 S.p.A. (settanta7.com)
PIVA 12396810017

rideterminati con riferimento al D.M. 17 Giugno 20216, applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

4. La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata sul bilancio dell'ente sul cap. 2336 (04.02-2.02.01.09.003) "realizzazione nuova scuola media"; avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con i codici CUP I88E18000210006 – CIG 9300614578. Il servizio di cui al presente contratto rientra nel quadro economico dell'opera, finanziata dal MIUR con il Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 (confluito con Decreto di riparto n.192/2021 nell'Investimento PNRR: M4C1 - Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili nonché da fondi propri dell'Ente.

5. Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto. Essi si intendono comprensivi di onorari, delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa al servizio affidato.

6. Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

7. Gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del DPR 633/1972, sono assolti dalle singole imprese costituenti il raggruppamento relativamente alle prestazioni di competenza, nel rispetto delle quote percentuali di partecipazione indicate al punto 5 dell'atto di costituzione del RTI.

8. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente con le seguenti modalità:

- progettazione esecutiva: all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di

COMUNE DI MOZZECANE
37060 - MOZZECANE (Verona)

SETTANTA7 S.R.L.
Corso Re Umberto I 13 - 10121 Torino
arredamenti@settanta7.com
www.settanta7.com
PIVA 12396810017

Mozzecane;

- direzione dei lavori: in rapporto percentuale agli stati di avanzamento dei lavori

ART. 4 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n 136. A tale fine si impegna:

a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

b) a comunicare al Comune di Mozzecane gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori / servizi / forniture oggetto del presente contratto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Mozzecane che la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di Mozzecane potrà richiedere all'Appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c) del comma 1; l'appaltatore si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA.



ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal disciplinare di gara e relativi allegati, approvati con Determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.95 del 14.07.2022.
2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati indicati al precedente comma 1, che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante" e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. Vengono materialmente allegati al contratto: l'offerta tecnica (allegato B) e il report della procedura Sintel Id 157054541 contenente l'offerta economica (allegato C).
3. Le Parti danno atto che il servizio oggetto di contratto riguarda un intervento ricompreso nel PNRR (Investimento PNRR: M4C1 - Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica); l'Appaltatore pertanto si impegna a rispettare le disposizioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021 n.32 sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
4. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Appaltatore si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n.1 copia cartacea firmata in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e firmata digitalmente, oltre a copia dei file in formato editabile.
5. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, la "Stazione appaltante" può richiedere all'Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

STAZIONE APPALTANTE (AGI/US)
MOZZECANE
Via C.B. Brenzoni n. 26
37060 - MOZZECANE (Verona)

SETTANTA7 S.R.L.
C.so Re Umberto, 13 - 10121 Torino
amministrazione: info@settanta7.com
fatture: fatture@settanta7.com
www.settanta7.com
PIVA 2396810017

6. L'Appaltatore" è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art.1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.


7. Sono a carico dell'Appaltatore" gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

ART. 6 - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

1. L'Appaltatore", in conformità a quanto previsto dall'art.3 del Disciplinare di gara, deve ultimare il servizio secondo il seguente cronoprogramma:

- redazione del progetto esecutivo (con i contenuti necessari alla conclusione positiva del processo di verifica e validazione del progetto), incluse progettazione strutturale, impiantistica ed antincendio nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 30 gg naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione con consegna e avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dell'art.8 comma 1 lettera b) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: dovranno essere puntualmente rispettate le tempistiche stabilite dal D.Lgs.n.50/2016, dal DM 49/2018, dal DPR 207/2010 nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto

2. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore" nell'espletamento dell'incarico in oggetto, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dalla "Stazione Appaltante", ovvero di proroghe concesse è



applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per tutte le eventuali controversie nell'applicazione del presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto specificato dal Disciplinare di gara e dal presente contratto.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente è quello di Verona.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n.2362126 rilasciata in data 03.10.2022 per un importo complessivo di 86.834,35, pari al 46,97% del costo del servizio. Secondo quanto previsto dall'art.93 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 la somma da garantire è pari al 93,94% (un punto percentuale per ogni punto di ribasso fino al 20%, due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%) in quanto il ribasso offerto in sede di gara è pari al 56,97%; la somma da garantire, pari al 93,94%, è successivamente ridotta secondo le modalità indicate dall'art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede la riduzione della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazioni rilasciate ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal medesimo articolo sopra richiamato.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante

SELIANIA/S.R.L.
CORSO PO-HUMBOLDT, 13 - 10121 TORINO
AMMINISTRAZIONE@SELIANIA.IT
SELIANIA7SR@GALPAITALY.IT
WWW.SELIANIA7.COM
PIVA 12396810017

SELIANIA/S.R.L.
Via C. B. Broletto, 10
37068 - MOZZECANE (Verona)

l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, alla firma del presente contratto l'Appaltatore ha prodotto, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale. L'Appaltatore è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.1836984 rilasciata in data 31.01.2022 da Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Mecenate n. 90 a Milano, con massimale di 7.500.000,00€. La polizza assicurativa è integrata, ai sensi di legge, con apposita dichiarazione di impegno alla costituzione della polizza di responsabilità civile professionale relativa alla copertura per i danni derivanti dalle nuove spese di progettazione delle opere, nonché da maggiori costi per le varianti in conseguenza di errori e omissioni nel progetto esecutivo da porsi a base di gara, che dovrà essere operativa a far data all'approvazione del progetto esecutivo.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

ART. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della "Stazione appaltante", in Via Caterina Bon Brenzoni, 26 – Mozzecane (Verona).

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della "Stazione appaltante".

ART. 14 - REGISTRAZIONE

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR. 16.04.2013 N. 62 sono estesi all'appaltatore per quanto

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. B. Brenzoni n. 26
37060 Mozzecane (Verona)
SETTANTA7 S.R.L.
Corso Re Umberto, 13 - 10121 Torino
amministrazione@settantasetta.it
settantasetta7@settantasetta7.com
www.settantasetta7.com
PIVA 12396810017

compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice sopra richiamato e dal Codice di comportamento interno del Comune di Mozzecane approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2014, esecutiva. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva del rapporto in caso di violazione di detti obblighi da parte dell'appaltatore.

ART. 16 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'"Appaltatore", resteranno di proprietà piena ed assoluta della "Stazione Appaltante", la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'"Appaltatore" possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'"Appaltatore" medesimo.
2. L'"Appaltatore" si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
3. La "Stazione Appaltante" potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'"Appaltatore" in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'"Appaltatore" stesso.
4. La proprietà intellettuale è riservata all'"Appaltatore" a norma di Legge e la "Stazione Appaltante" autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Stazione Appaltante.

ART. 17 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679:
 - a) relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "titolare" del trattamento è il Comune;

SELTANTAZ S.R.L.
Corso Repubblica Umbra, 13 - 10121 Torino
gratuita: 800 00 00 00 / 02 11 22 11 11
www.seltantaz.com
PINA 1239681091 /

- b) "responsabile" del suddetto trattamento è il Responsabile del Servizio Contratti, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente e per ciò che riguarda i pagamenti è il Responsabile del Settore Risorse Interne e Tributi;
- c) responsabile della protezione dei dati personali è l'avv. Diego Perini, DPO del Comune di Mozzecane, avente sede legale in Verona – Stradone San Fermo 13, e-mail dpo@comunemozzecane.it.;
- d) il trattamento è previsto come obbligatorio dalla legge (d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.);
- e) il Comune tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, inerenti e conseguenti al presente contratto;
- f) il trattamento cesserà a completa esecuzione e rendicontazione del contratto e che, dopo tali eventi il fascicolo relativo al contratto e ai documenti sarà depositato in archivio;
- g) lo stesso appaltatore potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, mediante invio di una email all'indirizzo PEC protocollo@pec.comunemozzecane.it.

2. Ai sensi del D.M. 22.02.2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto dall'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, nel quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne perfettamente il contenuto.

Io sottoscritto Segretario rogante certifico che i documenti allegati in copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b), formati in originale su supporto analogico, sono conformi all'originale ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 3, del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in un unico originale, è stato redatto da

MOZZECANE
S. 11. 26

Verona)

26

Modello

Rosa

SETTANTA7 S.R.L.
Corso Re Umberto, 13 - 10121 Torino
amministratore: roberto.settanta7@comuni.it
contabile: roberto.settanta7@comuni.it
www.settanta7.com
PIVA 12396810011

Settanta7

persona di mia fiducia, mediante utilizzo di strumenti informatici su n. 12 pagine a video.

Io Segretario rogante attesto che le parti sottoscrivono il presente atto con firma autografa acquisita digitalmente mediante scanner, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

Comune Mozzecane

Arch. Lisa Modenini

Settanta7 Srl

Arch. Elena Rionda



Segretario Generale

Dott. Luciano Gobbi

COMUNE DI MOZZECANE

Via C.B. Brenzoni n. 26

37060 - MOZZECANE (Verona)



ALL A)



Dr. Salvatore Barbagallo
NOTAIO

10123 Torino - Via Pomba, 17
Tel. 011.43.88.400 - Fax 011.53.98.28
Sbarbagallo2@notariato.it

REP. N. 34602 RACC. N. 20659.....

COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO FRA IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.....

Il giorno trenta del mese di settembre.....

(30 - 9 - 2022).....

In Torino, nel mio Studio in Via Pomba n. 17.....

Innanzi a me Dottor Salvatore BARBAGALLO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza dei testimoni,.....

E' PRESENTE LA SIGNORA:

arch. RIONDA ELENA, nata a Torino il 12 aprile 1977, domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 13, codice fiscale: RND LNE 77D52 L219M,..... la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società:

- "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" siglabile "SETTANTA7 S.R.L.", con sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 13, capitale sociale di Euro 10.521,00 (diecimilacinquecentoventuno) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita I.V.A.: 12396810017;.....

sia quale procuratrice speciale della società:

- "GPA S.R.L.", con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), Via Giovanni da San Giovanni n. 87, capitale sociale di Euro 95.000,00 (novantacinquemila) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, codice fiscale e partita I.V.A.: 01315880516;.....

in virtù di procura speciale ricevuta dal Notaio Emanuela ELEFANTE di Firenze in data 22 settembre 2022, rep. n. 6009, che, in copia certificata conforme all'originale, contenuta su supporto informatico, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dalla comparente la lettura.....

Detta comparente, cittadina italiana, come essa stessa afferma della cui identità personale io Notaio sono certo,.....

- premesso -.....


a) che il "Comune di Mozzecane", con sede in Mozzecane (VR), Via Caterina Bon Brenzoni n. 26, Codice Fiscale: 00354500233, con Determinazione a contrarre del Settore Territorio e Ambiente n. 95 del 14 luglio 2022, ha stabilito di affidare l'appalto del servizio tecnico di redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, nel Comune di Mozzecane, da edificarsi sull'area comunale sita in Mozzecane (VR), Via dell'Aviatore, adiacente alla scuola materna "B. Zaccagnini" - CUP: I88E18000210006 - CIG: 9300614578;.....

b) che per l'affidamento del suddetto servizio la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Villafranca di Verona e di Mozzecane, per conto del Comune di Mozzecane, ha indetto una gara d'appalto telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, lett. b) del Codice dei contatti pubblici e che le società "SETTANTA7 SOCIETA' A

REGISTRATO
ALL'UFFICIO
TERRITORIALE
DI TORINO - DP II
il 07/10/2022
n° 46759 Serie IT

COMUNE DI MOZZECANE
Via C.B. Brenzoni n. 26
37060 - MOZZECANE (Verona)

A. Modugno



RESPONSABILITA' LIMITATA" e "GPA S.R.L." hanno convenuto di presentare offerta congiuntamente in raggruppamento temporaneo fra imprese di tipo misto impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a formalizzare detto raggruppamento temporaneo;

c) che il "Comune di Mozzecane", con Determinazione n. 133 del 16 settembre 2022, ha comunicato alla società "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", a mezzo PEC Prot. n. 8294 del 19 settembre 2022, l'aggiudicazione del suddetto servizio in favore del costituendo raggruppamento temporaneo e pertanto ha richiesto di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparsa stipula e conviene quanto segue:

1) Le società "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "GPA S.R.L.", come sopra rappresentate, si costituiscono in raggruppamento temporaneo fra imprese di tipo misto al fine di realizzare il servizio di cui in premessa o altri eventuali servizi aggiuntivi che la stazione appaltante intenderà affidare relativamente al contratto di appalto di cui sopra.

2) La società "GPA S.R.L.", come sopra rappresentata, conferisce irrevocabile mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società costituita in Italia, che, come sopra rappresentata, accetta, nonché relativa procura ai suoi legali rappresentanti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs 50/2016, con facoltà degli stessi di delegare a terzi, sotto la loro esclusiva responsabilità e nelle forme di legge, in tutto o in parte, i poteri agli stessi conferiti.

La società mandataria, a mezzo dei suoi Legali Rappresentanti, od eventuali procuratori che gli stessi vorranno nominare, potrà validamente:

a) presentare documenti, dichiarazioni, certificazioni e quant'altro utile o necessario per l'esecuzione del servizio di cui sopra;

b) stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni più ampio potere e promessa di rato et valido fino da ora sotto gli obblighi di legge, il contratto di cui alle premesse e tutti gli atti contrattuali connessi;

c) gestire i rapporti contrattuali nei confronti del Committente, sottoscrivere documenti contrattuali, riserve, contestazioni e corrispondenza in genere, determinare e sottoscrivere transazioni, compiere qualsiasi atto ed assumere qualsiasi iniziativa per la migliore esecuzione del servizio e/o delle altre prestazioni;

d) rappresentare esclusivamente, anche processualmente, la mandante nei confronti del committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'acquisizione ed esecuzione del contratto di cui alle premesse, anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto con il "Comune di Mozzecane";

e) compiere ogni altro atto od operazione utile ed opportuna per l'evasione del presente mandato.

Perciò per tutte le operazioni inerenti il suddetto mandato i legali rappresentanti della mandataria, od eventuali procuratori che gli stessi vorranno nominare firmeranno per conto ed in rappresentanza della mandataria e della società mandante compiendo altresì tutti gli atti incumbenti che si rendessero necessari ed opportuni all'espletamento del presente mandato.

Il tutto con promessa di rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica.....

Il presente mandato-procura è gratuito ed irrevocabile in quanto deve intendersi rilasciato anche nell'interesse del mandatario procuratore con l'obbligo di rendiconto.....

Per espressa volontà delle imprese sopra costituite l'eventuale revoca del presente mandato, anche per giusta causa, sarà inefficace nei confronti del committente.....

3) La modalità di fatturazione di tutto il corrispettivo verrà stabilita in sede di stipula del relativo contratto di appalto.....

Le parti, come sopra rappresentate, danno atto che i prezzi e le condizioni del contratto di cui alle premesse sono noti ed accettati da tutte.....

Le imprese si obbligano ad ottemperare a quanto disposto alla L. 136/2010 e ssm relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.....

4) Tutti i documenti di progetto saranno firmati congiuntamente dai componenti del presente raggruppamento temporaneo fra imprese. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, tutti risponderanno direttamente in misura proporzionale alla quota progettata di rispettiva competenza per:.....

- responsabilità civile per danni patrimoniali cagionati a terzi;.....

- risarcimento di spese imputabili all'associazione per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto;.....

- risarcimento dei danni derivanti da interruzione di attività di servizi, qualora fossero richiesti al raggruppamento temporaneo fra imprese dal committente o da terzi, danni o ritardi.....

5) La società "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" sarà la coordinatrice del raggruppamento temporaneo fra imprese e l'incaricata delle integrazioni delle prestazioni specialistiche.....

Si precisano inoltre le parti del servizio e le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento:.....

= "SETTANTA7 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", capogruppo/mandataria, si occuperà della progettazione architettonica (categoria E.08), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori e coordinamento dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, quota pari al 55% (cinquantacinque per cento);.....

= "GPA S.R.L.", mandante, si occuperà della progettazione strutturale (categoria S.03) e impiantistica (categorie IA.01, IA.02 e IA.03) e direzione operativa strutturale (categoria S.03) e impiantistica (categorie IA.01, IA.02 e IA.03), quota pari al 45% (quarantacinque per cento);.....

6) Il presente raggruppamento temporaneo fra imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità ed adempimenti:.....

a) con lo spirare dei termini contrattuali, salvo proroghe da parte del "Comune di Mozzecane" e con la liquidazione di tutte le pendenze;.....

b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto previste dal vigente ordinamento.....

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazioni fra le Imprese riunite, ognuna delle quali assume la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.....

Le parti, come sopra presenti e rappresentate, si dichiarano edotte del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e dell'antiriciclaggio.....

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto alla comparente che lo approva.....

Consta di due fogli scritti su sei intere pagine e sin qui della settimana.....

Sottoscritto alle ore quindici e trenta.....

In originale firmato:.....

ELENA RIONDA.....

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO.....

=====

Allegato "A" all'atto
in data 30-09-2022
rep. n. 34602/20659



Repertorio n. 6.009

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue del mese di settembre dell'anno
duemilaventidue, in Firenze e nel mio studio.
(22/09/2022)

Innanzi a me dottoressa EMANUELA ELEFANTE, Notaio in Firenze, con
studio ivi in Via Lorenzo il Magnifico n.22, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

--- **SPINELLI Matteo**, nato a Firenze (FI) il 28 giugno 1980, domiciliato
per la carica ove appresso, in qualità di Consigliere Delegato e Legale
rappresentante della Società "GPA S.R.L." (già G.P.A. Ingegneria - S.R.L.)
con sede in San Giovanni Valdarno (AR), Via Giovanni da San Giovanni
n.87, capitale sociale euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero
zero), interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo: 01315880516, R.E.A.: AR-
97617, pec: info@pec.gpapartners.com, munito dei necessari poteri per la
firma del presente atto in virtù di legge e del verbale del Consiglio di
Amministrazione del 16 ottobre 2020, regolarmente iscritto nel Registro
delle Imprese di Arezzo-Siena in data 19 novembre 2020.

Dell'identità personale e poteri del costituito io notaio sono certo.

La società GPA S.R.L., come sopra rappresentata, nomina suo

PROCURATORE SPECIALE

l'architetto **RIONDA Elena**, nata a Torino il 12 aprile 1977, residente in

Torino, Via Beaumont n. 48, codice fiscale: RND LNE 77D52 L219M, in
qualità di legale rappresentante della società "Settanta7 Studio a
Responsabilità Limitata", con sede legale in Torino, Corso Re Umberto
n.13, codice fiscale e partita I.V.A. n.: 12396810017, _____

AFFINCHÈ


in nome e per conto della società mandante, ed anche in proprio e/o in
rappresentanza di altri soggetti, con espressa autorizzazione a contrarre
con sé stessa e con esclusione di qualsivoglia conflitto di interessi,
intervenga in nome, conto e rappresentanza della suddetta società all'atto
di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP)
e mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e della normativa vigente, per "l'appalto del servizio tecnico di
redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della
nuova scuola secondaria di primo grado del Comune di Mozzecane. CUP
I88E18000210006, CIG 9300614578", di cui alla gara europea a
procedura telematica aperta del Comune di Mozzecane, insieme a: _____

- "Settanta7 Studio a Responsabilità Limitata", con sede legale in Torino,
Corso Re Umberto n.13, codice fiscale e partita I.V.A. n.: 12396810017, in
qualità di mandataria - Capogruppo. _____

La nominata procuratrice è autorizzata, con la specifica autorizzazione di
cui all'art. 1395 CC, e con esclusione di qualsivoglia conflitto di interessi,
a: _____

- intervenire e sottoscrivere l'atto di costituzione; _____

- conferire mandato all'impresa Capogruppo; _____



- conferire procura speciale al legale rappresentante dell'impresa

Capogruppo; _____

- visionare e sottoscrive documenti; _____

- determinare le percentuali di partecipazione al Raggruppamento, secondo gli specifici accordi delle parti e quanto indicato nella domanda di partecipazione di gara; _____

- determinare le parti di servizio e lavoro attribuiti a ciascun partecipante;

- determinare gli eventuali giovani professionisti progettisti che eseguiranno gli incarichi; _____

- compiere in genere qualsiasi altro atto necessario per la costituzione del predetto Raggruppamento temporaneo tra professionisti, sempre in nome e per conto della parte conferente procura, con promessa fin d'ora di avere per rato e valido l'operato in qualità di Procuratrice, senza bisogno di ulteriori ratifiche e nel rispetto degli obblighi di legge. _____

La presente procura è conferita a titolo gratuito e con obbligo di rendiconto, con promessa di rato e valido. _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me letto al
comparente, che lo approva. Scritto in parte a macchina da persona di mia
fiducia e in parte a mano da me Notaio su fogli 010 per pagine

400 — il presente atto viene sottoscritto dal comparente e

me notaio, alle ore 15 (quindici) e minuti 5 (cinque).


Notte di notte
Emanuela de la...


A circular notary seal with a central emblem and text around the perimeter, partially overlapping the handwritten text.

Certifico io dottoressa EMANELA ELEFANTE notaio in Firenze, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, come modificato dall'art. 15 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n.235.

Firenze, 22 settembre 2022

Firmato: Emanuela Elefante (sigillo)







Dr. Salvatore Barbagallo
NOTAIO

10123 Torino - Via Pomba, 17
Tel. 011.43.88.400 - Fax 011.53.98.21
Sbarbagallo.2@notariato.it

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO

CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO

(art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, Dottor Salvatore Barbagallo, Notaio in Torino, del Distretto Notarile di Torino e Pinerolo, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di cinque pagine su numero tre fogli, è conforme al documento informatico sottoscritto digitalmente, ai sensi dall'art. 22 D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 68 ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Emanuela ELEFANTE di Firenze, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Torino, lì 30 settembre 2022.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Barbagallo'. The signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO SALVATORE BARBAGALLO' and 'DISTRETTO NOTARILE DI TORINO E PINEROLO'. To the left of the signature, there is a faint, partially visible stamp or mark.



Dr. Salvatore Barbagallo
NOTAIO

10123 Torino – Via Pomba, 17
Tel. 011.43.88.400 – Fax 011.53.98.21
Sbarbagallo.2@notariato.it

.....CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE.....

.....AD ORIGINALE ANALOGICO.....

.....(art. 22 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82;.....

.....art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89).....

Certifico io sottoscritto Dott. Salvatore Barbagallo, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti e firmato a norma di legge.....

Torino, lì 7 ottobre 2022.....



CRITERIO A

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OPERATORE ECONOMICO



Acc. B)

B
D
I
B
E
L
F
U
S
A
T
A
S
C
A

SETTANTAV7 S.R.L.
Corso Tre Umberto, 13 - 10121 Torino
amministrazione@settantav7.com
settantav7@edilogs.it
www.settantav7.com
PIVA 12396810017

COMUNE DI MOZZECANE
Via C.B. Brenzoni n. 26
37060 - MOZZECANE (Verona)


Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio tecnico di redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori, realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado.

RTP
Settantav7 S.r.l.: GPA S.r.l.
Settantav7

Ass. Moduleri

Indice : RELAZIONE METODOLOGICA

CRITERIO A
PROPOSTA
METODOLOGICA
DI SERVIZIO
PP. 01-10

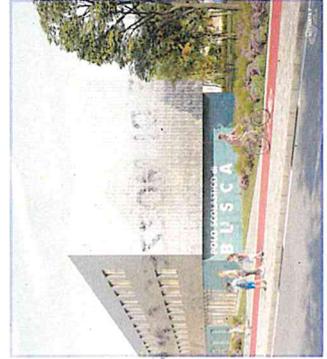

A - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'OPERATORE ECONIMICO

- **A.1** PP 01
Capacità della struttura organizzativa di svolgere l'incarico in termini di tempestività e costanza, approfondimento tecnologico e normativo, flessibilità e adattamento della struttura in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e ad eventuali eventi imprevisiti
- **A.2** PP 01
Modalità di interazione e/o integrazione con la committenza e con i portatori di interesse nelle diverse sedi, con valutazione di pregresse esperienze di progettazione e direzione lavori di opere attraverso percorsi di partecipazione
- **A.3** PP 02
Costituzione di un gruppo di lavoro in grado di garantire una presenza costante e continuativa in cantiere di figure professionali dotate delle necessarie competenze
- **Allegato 1** PP 03
Risorse strumentali e informatiche messe a disposizione
- **Allegato 2** PP 04
Organigramma in fase di progettazione
- **Allegato 3** PP 05
Organigramma ufficio direzione lavori
- **Allegato 4** PP 06
CV dei professionisti personalmente responsabili
- **Allegato 5** PP 17
Certificazioni

Sub-Criterio A1 Capacità della struttura organizzativa di svolgere l'incarico in termini di tempestività e costanza, approfondimento tecnologico e normativo, flessibilità e adattamento della struttura in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e ad eventuali eventi imprevisi

Nella gestione della commessa adottiamo un **approccio Agile**, basato su **cicli brevi** che si adattano ai feedback della S.A. e ad eventuali variazioni dovute a fattori esterni. Nello specifico, la metodologia proposta è organizzata secondo uno schema a **"Roadmap", suddiviso in 4 macro-fasi**.

Ad ognuna corrisponderanno specifiche procedure operative che, con riferimento ai **Sistemi di Controllo Qualità**, saranno identificate e codificate nel **Piano di Lavoro (PL)** e di **Gestione Informativa**.


Si tratta di uno sviluppo iterativo e incrementale basato sulla scomposizione delle attività in macro-step, organizzati in modo gerarchico e prioritario attraverso **WBS** e in funzione di intervalli temporali ben precisi. Una volta articolate le attività, stileremo una **RAM**, **Responsability Assignment Matrix** e una **OBS**, **Organization Breakdown Structure**.

strumenti indispensabili per una gestione ottimale del processo.

Lo stato di avanzamento della progettazione sarà monitorato dal **Product Owner**, figura all'interno del team di progettazione che si interfaccierà con gli stakeholders e garantirà assistenza costante alla S.A. Analizzerà gli scostamenti tra quanto previsto e quanto consuntivato ed introdurrà eventuali **azioni correttive per garantire il rispetto della qualità, dei costi e dei tempi del progetto, soprattutto in funzione delle scadenze previste dal PNRR**.

Di seguito le fasi:

1. **Attività preliminari alla progettazione**
2. **Attività propedeutiche alla progettazione**
3. **Sviluppo della progettazione**
4. **Attività di accompagnamento all'approvazione**

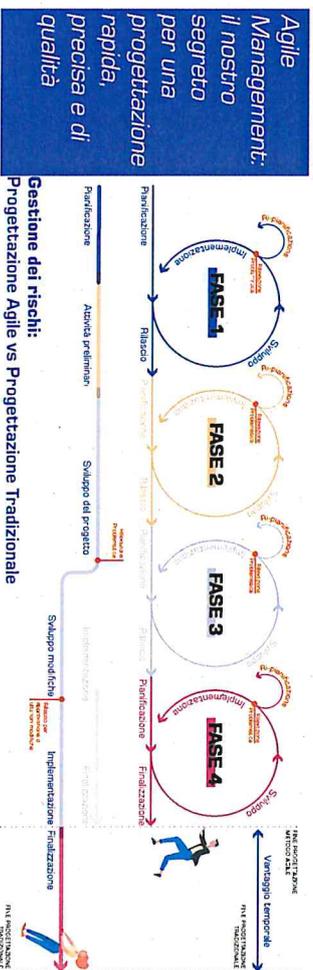

Agile Management: il nostro segreto per una progettazione rapida, precisa e di qualità

Sub-Criterio A2 Modalità di interazione e/o integrazione con la committenza e con i portatori di interesse nelle diverse sedi, con valutazione di pregresse esperienze di progettazione e direzione lavori di opere attraverso percorsi di partecipazione

Illustriamo di seguito la proposta metodologica di un percorso finalizzato a **coningere ascolto attivo e partecipazione**, per raccogliere e valorizzare il maggior numero di punti di vista e di proposte della comunità interessata.

L'obiettivo è, infatti, quello di giungere ad una progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo edificio che sappia fare tesoro dei contributi dei partecipanti per realizzare una struttura capace di rispondere al meglio alle esigenze e alle aspettative della comunità.

In questo quadro, il percorso si propone di valorizzare, con modalità concrete e replicabili, la partecipazione attiva della comunità locale al fine di realizzare una scuola caratterizzante e identitaria per l'intera città, un importante punto di riferimento e luogo di scambio.

Ci proponiamo di utilizzare l'**Human centered design**, il design antropocentrico, come strumento che coinvolge la prospettiva umana in tutte le fasi dell'iter progettuale.

Il design centrato sull'uomo è un approccio alla progettazione che ci permetterà di **rendere ottimali ed intuitivi i futuri spazi, concentrando i sui fruitori, sui loro bisogni ed aspettative**.


Il nostro obiettivo fondamentale è garantire il benessere umano, la soddisfazione degli utenti, l'accessibilità, la sicurezza e le prestazioni, anticipando ogni possibile criticità.

Precedenti esperienze partecipative

Realizzazione di plastici architettonici: Per una migliore interpretazione degli ambienti interni da parte della futura utenza, come nella scuola primaria di San Carlo Canavese (TO)

Scelta di colori e grafiche: Per la scuola media Silvio Pellico di Varese, gli alunni e il personale della scuola sono stati chiamati a scegliere i nuovi colori degli ambienti interni.

Materiali e finiture Numerosi eventi sono stati organizzati per il Centro Civico Comunale di Lurate Caccivio. I partecipanti hanno preso parte un percorso strutturato che prevedeva una serie di incontri culminati da un momento di workshop finale per la scelta di materiali e finiture.



Focus group per la Biblioteca di Lurate Caccivio

Sub-Criterio A3 Costituzione di un gruppo di lavoro in grado di garantire una presenza costante e continuativa in cantiere di figure professionali dotate delle necessarie competenze

Da anni **Settanta7 S.r.l.**, **GPA S.r.l.** collaborano in modo sinergico, offrendo un gruppo di lavoro completo, multidisciplinare e specializzato, in grado di gestire ampiamente con la massima efficienza tutte le fasi di intervento, dalla progettazione fino alla realizzazione finale dell'opera. Ripartiamo di seguito l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio in oggetto:

professionisti responsabili	qualificazione professionale	incarico	Opere analoghe
GIOVANNI CARDINALE Direttore tecnico di GPA Srl	Ingegnere, O.I. Arezzo sez. A al n. 339 dal 1977	Progettista impiantistico meccanico e D. O. impiantistico meccanico	- Florida State Campus in Firenze / Importo dei lavori: € 5.058.000,00 / Classi e categorie: E.22 - E.18 - S.06 - IA.01 - IA.02 - IA.04 / Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE - DL / Periodo di esecuzione del servizio: 07/2018- 10/2020; Spazio espositivo commerciale Prada in Galleria Vittorio Emanuele II di Milano / Importo dei lavori: € 1.726.000,00 / Classi e categorie: E.22 / Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE - CSP - BIM Management / Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015;
PAOLO SPINELLI Direttore tecnico di GPA Srl	Ingegnere, O.I. Prato sez. A al n. 207 dal 1993	Progettista impiantistico meccanico; Esperto in Gestione di Energia (EGE)	- Rifunionalizzazione Ex Pastificio Montevarchi (AR) / Importo dei lavori: € 3.125.003,16 / Classi e categorie: S.06 / Prestazioni: Rilievo, Indagini diagnostiche in situ e lab., Valutazione sicurezza, Indirizzi operativi per il miglioramento sismico;
MATTEO SPINELLI Direttore tecnico di GPA Srl	Architetto, O.A. Prato sez. A n.10742 / Certificato Esperto di edilizia sostenibile n. EES-12 rilasciato da Agenzia CERTING il 2021	Esperto in edilizia sostenibile e consulente CasaClima Progettista architettonico	- Museo della Memoria, Vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni (AR) / Importo dei lavori: € 768.917,00 / Classi e categorie: E.22 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03 / Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE - DL / Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015.
MASSIMO CECCONI Direttore tecnico di GPA Srl	Ingegnere O.I. FI sez. A n. 4188 dal 2000	Progettista antincendio	
MATTEO GESTRI Direttore tecnico di GPA Srl	Ingegnere, O.I. Prato sez. A n. 757 dal 1998.	Coordinatore progettazione impiantistica Progettista impiantistico	

professionisti responsabili	qualificazione professionale	incarico	Opere analoghe
DANIELE RANGONE Direttore Tecnico di Settanta7 S.r.l.	Architetto O.A. TO sez. A n.7547 dal 2007 / Certificazione Revit Avanzato, BIM Manager certificato ICMQ n°21-12837	Progettista architettonico, CSE, Direttore dei Lavori e Coordinatore dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	- Liceo scientifico A.M. Enriques Agnolenti a Sesto Fiorentino (FI) / cat. prevalente E.09 / PD - PE -CSP / Importo dei lavori: € 11.855.725,00 ; - Nuova area polifunzionale con auditorium, edificio scolastico e area sportiva a Silvi (TE) / cat.prevalente E.08 / PD - PE -CSP / Importo dei lavori: € 9.360.000,00 ;
ELENA RIONDA Direttore Tecnico di Settanta7 S.r.l.	Architetto O.A. TO sez.A n.6659 dal 2005 / In possesso di formazione specialistica valida ai fini dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	Progettista architettonico e Coordinatrice della Sicurezza in fase di Progettazione	- Nuovo Polo Scolastico, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado nel comune di Busca (CN) / cat. prevalente E.10 / PP, PD, PE, CSE, DL / € 7.750.000,00 ;
WALTER MONIACI Direttore Tecnico di Settanta7 S.r.l.	Ingegnere, O.I. TO sez.A n. 10764F , iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 4788 dal 10/12/2018	Progettista acustico	- Ristrutturazione e ampliamento con riqualificazione e ricomposizione urbanistica del complesso scolastico U. Foscolo, stralcio 1 e 2, Arcugnano (VI) / cat. prevalente E.10 / PP, PD, PE, CSP, DL / € 6.572.000,00 ;
STEFANO TUBERGA Direttore tecnico di Settanta7 Srl	Geologo, O.G. Reg. Piemonte sez. A al n. 534	Geologo	- Liceo Scientifico E.Fermi a Cosenza / cat. prevalente E.09 / PD - PE - CSP - DL - CSE / € 6.434.878,10 ;
MANUEL DEPETRIS Socio Settanta 7 S.r.l.	Architetto, O.A. TO sez.A, n. 10218 dal 2019, iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 11435 dal 2020	Progettista architettonico e acustico e Giovane professionista	- Nuovo Polo scolastico a San Martino di Lupari / cat. prevalente E.10 / PP - PD - PE - CSP - DL - CSE / € 4.236.404,97 ;
			- Nuovo polo scolastico nel comune di Sant'Alessandro a Caronno-Pertusella / cat. prevalente E.08 / PP - PD - PE - CSP - DL - CSE / € 3.966.800,63 ;

Allegato 1 | Risorse strumentali e informatiche messe a disposizione

Attrezzature, apparecchiature e software utilizzati, con particolare riferimento alla progettazione in BIM e alla presenza di programmi di elaborazione che garantiscono una celere verifica del progetto. Utilizziamo le più recenti risorse strumentali in termini di programmi e di dispositivi. La progettazione sarà sviluppata, sin dalle fasi di rilievo, fino alla **restituzione degli as built**, su piattaforma BIM, che ci permetterà di portare avanti in un **unico modello** gli aspetti architettonici, impiantistici, energetici ed economici legati all'intervento.

La nostra strumentazione per un rilievo a 360 gradi

Adoteremo un **approccio pluristrumentale** attraverso l'utilizzo di: Stazione totale Ruide R2, Drone SenseFly eBee e Laser Scanner 3D modello Focus Faro 130x SN. Saremo in grado di superare le tradizionali operazioni di rilievo tramite i **software Trueview e Jetstream**, che, impartata in Autodesk Revit, consentirà di restituire informazioni BIM complete.

Una progettazione integrata grazie agli strumenti BIM 7D

Grazie all'utilizzo del software **Autodesk Revit**, svilupperemo un unico modello tridimensionale federato di livello: 3 contenente la **totalità** dei dati tecnici. L'approccio BIM **faciliterà lo sviluppo delle fasi progettuali** e ne ridurrà i tempi di ultimazione, grazie ad un approfondimento progressivo del modello. Lavoreremo per **livelli di approfondimento grafico**, informativo e geome-

trico del modello (LOD), in modo da fornire tutte le indicazioni necessarie alla sua realizzazione. Raggiungeremo il **LOD D** nel progetto definitivo e il **LOD E** nel progetto esecutivo **secondo la norma PAS - 1192-2:2013**.

Utilizzeremo inoltre l'applicativo **Autodesk Navisworks** per l'operazione di **Clash detection**.

BIM 4D - Gestione del **cronoprogramma e delle fasi di intervento**. Saremo in grado di ottenere un modello integrato che tenga conto delle condizioni al contorno, delle criticità fisicamente presenti nell'area del cantiere e preesistenti al suo insediamento. **BIM 5D** - Gestione economica, dei computi quantità ed estimativi. Riusciremo a determinare con maggiore precisione la **stima dei costi del progetto, delle variazioni delle quantità e dei materiali**. La procedura di Quantity Takeoff avverrà tramite il software **ACCA Primus-IFC**, strumento **PRIMUS BIM** per estrarre rapidamente qualità in 2d o 3d in un foglio di calcolo Excel da utilizzare a fini di determinazione dei costi. Primus-IFC consentirà di ottenere in automatico e con metodo visuale il computo metrico di modelli

BIM in formato IFC, individuando le entità sul modello BIM - **BIM 6D** - Gestione post-operam. La sesta dimensione del Bim permette di ottimizzare la **gestione e la manutenzione dell'oggetto edilizio per tutto il suo ciclo di vita**, fornendo informazioni sui singoli componenti: dagli impianti tecnici alle finiture. Sfruttiamo le potenzialità del **software Mantus di Mantus**

ACCA, grazie al quale saremo **Piani di Manutenzione** in grado di redigere un Piano di Manutenzione complementare al progetto esecutivo. **BIM 7D**

- Sostenibilità del progetto. Grazie alla settima dimensione del BIM, riusciremo ad ottenere una progettazione secondo un approccio **TBL** (Triple bottom line).


Nello specifico **EdiClima** ci consentirà di integrare la fase di progettazione con le migliori pratiche di sostenibilità, in accordo con i C.A.M., per raggiungere l'obiettivo di un edificio nZEB.

Parallelamente, i nostri **Visual Artist**, forniranno un riscontro visivo del progetto, in modo da fornire una **visione completa** della futura realizzazione del manufatto architettonico. **Revit, 3DS Max, Adobe Ps, Adobe Ai, Adobe Id**.

Fase preliminare propedeutica alle successive fasi di progetto

Risorse strumentali a disposizione nelle diverse fasi

Restituzione As BUILT

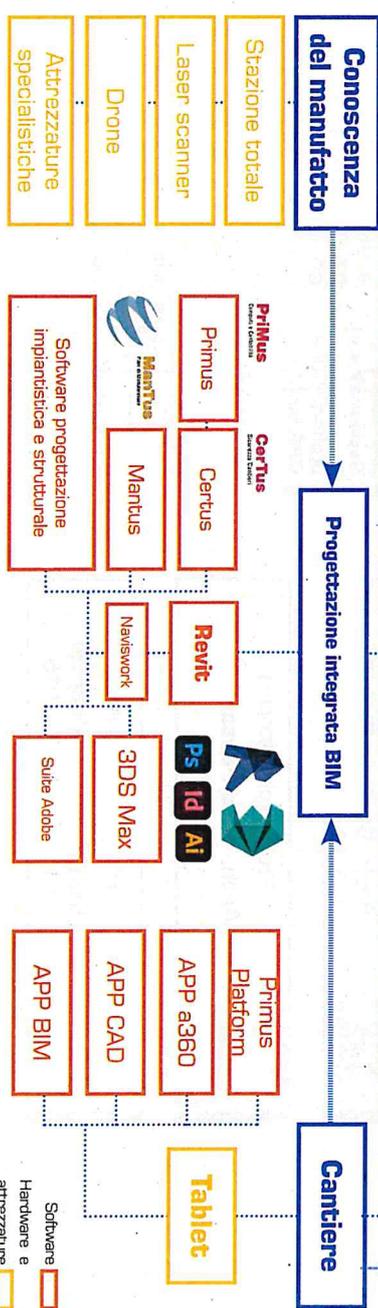

Allegato 3 | Organigramma ufficio direzione lavori

Ufficio DL




Direttore dei Lavori e CSE
arch. Daniele RANGONE (DTI)
 O.A. n°7547 dal 2007



Coordinatrice della Sicurezza in fase di Progettazione
arch. Elena RIONDA (DTI)
 O.A. n°6659 dal 2005



Direttore operativo architettonico
arch. Gianmarco Fornara (S)
 O.A. n°7547 dal 2007




Direttore Operativo strutturale
ing. Paolo Spinelli (DTI)
 O.I. Prato n° 207 dal 1993



Prog. architettonico e acustico giovane professionista
Arch. Manuel Depretis (S)
 O.A. n°10087 dal 2018



Direttore Operativo impiantistico elettrico
Ing. Matteo Gestri (DTI)
 O.I. Prato n° 757 dal 1998



Direttore Operativo impiantistico meccanico
ing. Giovanni Cardinale (DTI)
 O.I. AR n°339 dal 1977


Il nostro Team

Il nostro Team per l'Italia:

NORD EST



Construction Area Manager
Gianmarco Fornara



Executive Assistant
Francesca D'Anico



Site Manager
Giorgio Guccione



Martina Cappellini




HSE Manager
Christian Capizzi

Lavori Settanta7 + GPA



Intervento: "Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)"
 "Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto di istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR)"
 Importo dei lavori:
 Palaestra 1.753.000,00 €
 ISIS 4.200.000,00 €



Intervento: "Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, CRE per l'intervento denominato "Carmagnola 4R per una rigenerazione della città"
 Importo dei lavori: 5.101.498,39 €



Intervento: "Progetto di messa a norma antincendio, ristrutturazione e restauro dell'immobile "Ex I.R.V.E", corso Unione Sovietica - Torino"
 Importo dei lavori: 8.000.000,00 €



Intervento: "Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della nuova scuola primaria "La Fogliola" di Calenzano (FI)"
 Importo dei lavori: 4.400.000,00 €

Allegato 4 | CV dei professionisti personalmente responsabili



arch. **D. RANGONE**
socio di **Settanta7 s.r.l.**
O.A. di TO n°7547 dal
2007

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 2003 ed iscritto all'ordine degli architetti di Torino al n. 7547 dal 2007.

Ha conseguito una specializzazione in "Urbaniste et territoriales" e "Economie et politiques du logement". Master sull'efficienza energetica degli edifici, presso l'Université Paris XII Val de Marne, Parigi.

Nel 2009 fonda, insieme all'arch. Elena Rionda, Studio Settanta7 e successivamente Settanta7 srl. Grazie al suo lavoro per lo studio è considerato uno dei leader del settore sul suolo nazionale.

Ricopre con passione il ruolo di BIM Manager, Project Manager e di Coordinatore delle risorse dello studio.

Relatore in convegni nazionali ed internazionali organizzati da Next Energy, da Edicom Edizioni e dal Permanent Secretariat of Worlds Environmental che affrontano temi attuali del risparmio energetico e dell'architettura sostenibile.

— Corso di Revit certificato Autodesk AVANZATO

— Corso di Revit certificato BIM MANAGER

— Corso di Project Management: percorso di preparazione all'esame CAPM® (Certified Associate in Project Management) del PMI® (Project Management Institute)

— Corso Graphisoft ArchiCAD BASE

SOFT SKILL:

Creatività / Leadership / Specializzazione / Flessibilità / Memoria fenomenale / Multitasking / Carisma / Multipotenziale / Problem solving / Trascinatore



Committente: Università degli Studi di Padova (PD)
Oggetto dell'intervento: Nuova scuola di ingegneria - HUB dell'innovazione dell'Università di Padova (PD)

Importo dei lavori: € 15.000.000,00
Classi e categorie: E.10
Prestazioni: PD - PE - CSP - DL -

CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 06/2020 - in corso
Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
Tematiche: nzeb / leed Platinum / verificato CAM / giardini pensili / riuso strutture esistenti / ventilazione / costruire sul costruito



Committente: Provincia di Biella (BI)
Oggetto dell'intervento: Realizzazione della nuova scuola secondaria di secondo grado - area "EX ATAP" in Biella

Importo dei lavori: € 10.000.000,00
Classi e categorie: E.10
Prestazioni: PFTE - PD - PE - CSP -


Periodo di esecuzione del servizio: 10/2019 - 02/2020
Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
Tematiche: nzeb / leed / verificato CAM / palestra CONI / bioclimatica / istituto per scienze agrarie e alberghiero / giardini pensili



Committente: Comune di Valfenera (AT)
Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo plesso scolastico, Scuola primaria.

Importo dei lavori: € 2.800.000,00
Classi e categorie: E.08
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP -

DL - CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 02/2020 - 04/2020 (prog)
Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
Tematiche: nzeb / ITACA / verificato CAM / intervento innovativo / sostenibilità del sito / alto contenuto riciclato / sperimentazione



Committente: Città Metropolitana di Firenze
Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI).

Importo dei lavori: € 15.458.763,97
Classi e categorie: E.09
Prestazioni: PD - PE


Periodo di esecuzione del servizio: 12/2018 - 01/2020
Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
Tematiche: nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / intervento sostenibile / finalista THE PLAN AWARD 2019 / tecnologia vetrata / prefabbricazione / efficienza energetica



Committente: Comune di San Martirino di Lupari (PD)
Oggetto dell'intervento: Costruzione del nuovo polo scolastico

Importo dei lavori: € 4.236.404,97
Classi e categorie: E.08
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE

Periodo di esecuzione del servizio: 11/2019 - 04/2020 (prog)
Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
Tematiche: nzeb / LEED golden / verificato CAM / edificio in XLAM / solo materiali EPD / modellazione in regime dinamica / bassissimi consumi energetici / frangisole



Commititante: Comune di Brugnera (PN)
 Oggetto dell'intervento: Ricostruzione della scuola media secondaria di primo grado A. Carnova e realizzazione nuova scuola primari N. Sauro.
 Importo dei lavori: € 3.490.000,00 + € 2.375.000,00
 Tematiche: *nzeb / verificato CAM / demolizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia*



Commititante: Comune di Altopascio (LU)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado in via F. D'Assisi
 Importo dei lavori: € 4.860.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 03/2019 - 05/2019
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / studio dell'orientamento / bioedilizia / materiali sostenibili / frangisole / XLAM / ventilazione naturale / zero VOC*



Commititante: Provincia di Bitetto (BA)
 Oggetto dell'intervento: Nuova costruzione di una scuola media da 9 aule
 Importo dei lavori: € 1.906.168,16
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 03/2019 - DL e CSE in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / LEED gold / verificato CAM / XLAM / sostenibilità del sito / materiali con EPD / consumi energetici bassissimi / modellazione in regime dinamica*



Commititante: Comune di Grezzana (VR)
 Oggetto dell'intervento: Polo scolastico nel comune di Grezzana
 Importo dei lavori: € 4.100.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD
 Periodo di esecuzione del servizio: 11/2019 - 04/2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / verificato CAM / polo scolastico / didattica innovativa / tecnologie all'avanguardia / demolizione e ricostruzione*



Commititante: Comune di Gassino (TO)
 Oggetto dell'intervento: Nuovo polo scolastico nel comune di Gassino (TO)
 Importo dei lavori: € 4.080.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD
 Periodo di esecuzione del servizio: 2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / ITACA / verificato CAM / intervento innovativo / sostenibilità del sito / alto contenuto riciclato / sperimentazione / studio dell'ombreggiamento / terrazzi verdi / XLAM / bioclimatica*



Commititante: Comune di Busca (CN)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado
 Importo dei lavori: € 7.556.251,00
 Classi e categorie: E.10
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE - Supporto al RUP
 Periodo di esecuzione del servizio: 05/2018 - 12/2020 (prog)
 DL (in corso)
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / ITACA / verificato CAM / impianto a lotti realizzativi / XLAM / bioedilizia / ventilazione naturale / studio ombreggiamento*



Commititante: Comune di Prato (PO)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e palestra Pier Cironi
 Importo dei lavori: € 8.361.210,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 12/2020 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse.
 Tematiche: *nzeb / verificato CAM / intervento sostenibile / green HUB / spazi liberi / accessibilità / polo scolastico / didattica innovativa / sostenibilità edilizia / scuola nel verde*



Commititante: Comune di Arcugnano (VI)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola primaria e secondaria di primo grado
 Importo dei lavori: € 6.435.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL
 Periodo di esecuzione del servizio: 02/2018 - DL in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / verificato CAM / realizzazione in lotti / architettura iconica / XLAM / bioedilizia / impianti innovativi / impronta a terra ridotta / gold / certificabile LEED*



Commititante: Comune di Quorgne (TO)
 Oggetto dell'intervento: Scuola secondaria di primo grado G. Cena - sostituzione edilizia
 Importo dei lavori: € 6.243.550,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP - DL - CSE - supporto al RUP
 Periodo di esecuzione del servizio: 2019 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / ventilazione naturale / frangisole / materiali sostenibili / sostituzione edilizia*



Commititante: Comune di Villa Cortese (MI)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola primaria con palestra
 Importo dei lavori: € 6.380.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 09/2017 - 02/2018
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore delle risorse
 Tematiche: *nzeb / verificato CAM / edificio in XLAM / palestra CONI / illuminazione naturale / materiali riciclabili / bioedilizia*



arch. **E. RIONDA**
 socio di **Settanta7 s.r.l.**
 O.A. di TO n°6659 dal
 2005

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 2003 ed iscritta all'ordine degli architetti di Torino al n.6659 dal 2005.

Nel 2009 fonda, insieme all'arch. Daniele Rangone, Studio Settanta7 e successivamente Settanta7 srl. Rappresenta il principale referente amministrativo delle Stazioni Appaltanti.

Specializzata in progettazione e gestione della commessa e del cantiere edile. Si occupa della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di molte delle commesse di Settanta7.

Oltre ad essere specializzata in progettazione sostenibile e ad occuparsi della sicurezza è di sua competenza anche la gestione della commessa e della contabilità.

Ricopre spesso il ruolo di Quality Manager occupandosi di assicurare la qualità del processo, verificando la corrispondenza del prodotto finale.

— Corso di formazione specialistica "sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione" valido ai fini dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. - Correttamente aggiornato

— Corso di Revit certificato Autodesk AVANZATO

— Corso Graphisoft ArchiCAD BASE

SOFT SKILL:

Organizzazione / Leadership / Precisione / Flessibilità / Specializzazione / Multitasking / Carisma / Problem solving



Committente: Università degli Studi di Padova (PD)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola di ingegneria - HUB dell'innovazione dell'Università di Padova (PD)

Importo dei lavori: € 15.000.000,00
 Classi e categorie: E.10
 Prestazioni: PD - PE - CSP - DL -

CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 06/2020 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / leed Platinum / verificato CAM / giardini pensili / riuso strutture esistenti / ventilazione / costruire sul costruito



Committente: Comune di Busca (CN)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo polo scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado

Importo dei lavori: € 7.556.251,00
 Classi e categorie: E.10
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE - Supporto al RUP


Periodo di esecuzione del servizio: 05/2018 - 12/2020 (prog)
 DL (in corso)
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / ITACA / verificato CAM / impianto a lotti realizzativi / XLAM / bioedilizia / ventilazione naturale / studio ombreggiamento



Committente: Comune di Arcugnano (VI)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola primaria e secondaria di primo grado

Importo dei lavori: € 6.435.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL

Periodo di esecuzione del servizio: 02/2018 - DL in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / realizzazione in lotti / architettura iconica / XLAM / bioedilizia / impianti innovativi / impronta a terra ridotta / gold / certificabile LEED



Committente: Città Metropolitana di Firenze
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI).

Importo dei lavori: € 15.458.763,97
 Classi e categorie: E.09
 Prestazioni: PD - PE

Periodo di esecuzione del servizio: 12/2018 - 01/2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / intervento sostenibile / finalista THE PLAN AWARD 2019 / tecnologia vetrata / prefabbricazione / efficienza energetica



Committente: Comune di San Martino di Lupari (PD)
 Oggetto dell'intervento: Costruzione del nuovo polo scolastico

Importo dei lavori: € 4.236.404,97
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE

Periodo di esecuzione del servizio: 11/2019 - 04/2020 (prog)
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / LEED golden / verificato CAM / edificio in XLAM / solo materiali EPD / modellazione in regime dinamica / bassissimi consumi energetici / frangisole



Commititante: Comune di Brugnera (PN)
 Oggetto dell'intervento: Ricostruzione della scuola media secondaria di primo grado A. Carnova e realizzazione nuova scuola primari N. Sauro.
 Importo dei lavori: € 3.490.000,00 + € 2.375.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / deminizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia



Commititante: Comune di Altopascio (LU)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado in via F. D'Assisi
 Importo dei lavori: € 4.860.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 03/2019 - 05/2019
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / studio dell'orientamento / bioedilizia / materiali sostenibili / frangisole / XLAM / ventilazione naturale / zero VOC



Commititante: Provincia di Bitetto (BA)
 Oggetto dell'intervento: Nuova costruzione di una scuola media da 9 aule
 Importo dei lavori: € 1.906.168,16
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 03/2019 - DL e CSE in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / LEED gold / verificato CAM / XLAM / sostenibilità del sito / materiali con EPD / consumi energetici bassissimi / modellazione in regime dinamica



Commititante: Comune di Grezzana (VR)
 Oggetto dell'intervento: Polo scolastico nel comune di Grezzana
 Importo dei lavori: € 4.100.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD
 Periodo di esecuzione del servizio: 11/2019 - 04/2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / polo scolastico / didattica innovativa / tecnologie all'avanguardia / demolizione e ricostruzione



Commititante: Comune di Gassino (TO)
 Oggetto dell'intervento: Nuovo polo scolastico nel comune di Gassino (TO)
 Importo dei lavori: € 4.080.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD
 Periodo di esecuzione del servizio: 2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / ITACA / verificato CAM / intervento innovativo / sostenibilità del sito / alto contenuto riciclato / sperimentazione / studio dell'ombreggiamento / terrazzi verdi / XLAM / bioclimatica




Commititante: Provincia di Biella (BI)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione della nuova scuola secondaria di secondo grado - area "EX ATAP" in Biella
 Importo dei lavori: € 10.000.000,00
 Classi e categorie: E.10
 Prestazioni: PFTE - PD - PE - CSP - DL - CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 10/2019 - 02/2020
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / leed / verificato CAM / palestra CONI / bioclimatica / istituto per scienze agrarie e alberghiero / giardini pensili



Commititante: Comune di Prato (PO)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e palestra Pier Cirroni
 Importo dei lavori: € 8.361.210,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 12/2020 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / intervento sostenibile / green HUB / spazi liberi / accessibilità / polo scolastico / didattica innovativa / sostenibilità edilizia / scuola nel verde



Commititante: Comune di Valfenera (AT)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo plesso scolastico. Scuola primaria.
 Importo dei lavori: € 2.800.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 02/2020 - 04/2020 (prog)
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / ITACA / verificato CAM / intervento innovativo / sostenibilità del sito / alto contenuto riciclato / sperimentazione



Commititante: Comune di Quorogne (TO)
 Oggetto dell'intervento: Scuola secondaria di primo grado G. Cena - sostituzione edilizia
 Importo dei lavori: € 6.243.550,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP - DL - CSE - supporto al RUP
 Periodo di esecuzione del servizio: 2019 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / ventilazione naturale / frangisole / materiali sostenibili / sostituzione edilizia



Commititante: Comune di Villa Cortese (MI)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola primaria con palestra
 Importo dei lavori: € 6.380.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PD - PE - CSP
 Periodo di esecuzione del servizio: 09/2017 - 02/2018
 Ruolo svolto nel team: Coordinatore della sicurezza
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / edificio in XLAM / palestra CONI / illuminazione naturale / materiali riciclabili / bioedilizia



arch. **G. FORNARA**
 socio di **Settanta7 s.r.l.**
 O.A. di RO n°22962 dal
 2015

Laureato in Architettura presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 2015 ed iscritto all'ordine degli architetti di Roma al n.22962 dal 2015.

Nel 2017 ha conseguito un Master di II livello in: MGPCA- Gestione del progetto complesso di architettura presso Università "La Sapienza" di Roma con Stage didattici a ENSA Paris - Val de Seine e ETSA d. Vallés - Barcelona.

Nel 2019 inizia a collaborare con Settanta7 Studio Associato e successivamente con Settanta7 srl fino a diventare socio nel 2022.

All'interno dello studio ha svolto attività differenti fino a specializzarsi sulla fase di direzione lavori ricoprendo, nel 2021 il ruolo di Construction Area Manager per l'area del Nord-Ovest e del Centro Italia.

— Corso di Revit certificato Autodesk AVANZATO

— Corso di sicurezza nei cantieri costituente requisito professionale per poter operare come Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per la Esecuzione ex art. 98 D.Lgs 9-4-08 n.81 e s.m.i.

— Assistente didattico presso Università "La Sapienza" di Roma nel 2016 per il corso di "Tecnologia dell'architettura 3"

SOFT SKILL:

Flessibilità / Intraprendenza / Leadership / Team player / Creatività / Problem solving / Carisma



Committente: Comune di Busca (CN)
 Oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo polo scolastico scuole primaria e secondaria di primo grado
 Importo dei lavori: € 7.556.251,00
 Classi e categorie: E.10
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE - Supporto al RUP

Periodo di esecuzione del servizio: 05/2018 - 12/2020 (prog)
 DL (in corso)
 Ruolo svolto nel team: direzione lavori in cantiere

Tematiche: nzeb / ITACA / verificato CAM / impianto a lotti realizzativi / XLAM / bioedilizia / ventilazione naturale / studio ombreggiamento




Committente: Comune di Arcugnano (VI)
 Oggetto dell'intervento: Nuova scuola primaria e secondaria di primo grado in frazione Torri

Periodo di esecuzione del servizio: 02/2018 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Direzione dei lavori in cantiere

Importo dei lavori: € 5.500.000,00
 Classi e categorie: E.08
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - CSE - DL

Tematiche: nzeb / verificato CAM / realizzazione in lotti / architettura iconica / XLAM / bioedilizia / impianti innovativi / certificabile LEED



Committente: Comune di Bergamo
 Oggetto dell'intervento: Costruzione nuova palestra nel quartiere S. Tomaso de' Calvi

CSE
 Periodo di esecuzione del servizio: 10/2020 - 01/2022 (prog)
 Ruolo svolto nel team: Assistenza alla progettazione architettonica

Importo dei lavori: € 2.425.000,00
 Classi e categorie: E.12 - S.03 - S.04 - IA.01 - IA.02 - IA.03
 Prestazioni: PD - PE - CSP - DL -


Tematiche: nzeb / verificato CAM / intervento innovativo / sostenibilità del sito



Committente: Comune di Cavallermaggiore (CN)
 Oggetto dell'intervento: Ristrutturazione ed ampliamento della palestra inserita nell'area scolastica per la realizzazione del polo scolastico con biblioteca e riqualificazione urbana (lotto1)

Importo dei lavori: € 2.800.000,00
 Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
 Prestazioni: PD - PE - CSP - DL - CSE

Periodo di esecuzione del servizio: 03/2020 - 09/2021 (prog)
 Ruolo svolto nel team: Assistenza alla progettazione architettonica



Committente: Provincia di Pavia
 Oggetto dell'intervento: Costruzione del nuovo liceo "L.G. Faravelli" in Broni (PV)


Periodo di esecuzione del servizio: 02/2021 - 06/2021
 Ruolo svolto nel team: Progettazione in fase di gara

Tematiche: nzeb / verificato CAM / integrazione con le presistenze storiche / nuovo edificio / didattica innovativa

Importo dei lavori: € 6.800.000,00
 Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.02 - IA.03
 Prestazioni: PFTE



Committente: Comune di Brugnera (PN)
Obgetto dell'intervento: Ricostruzione della scuola media secondaria di primo grado A. Canova e realizzazione nuova scuola primari N. Saurò.
Importo dei lavori: € 3.490.000,00 + € 2.375.000,00
Classi e categorie: E.08 - DL - CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 2020
Ruolo svolto nei team: Assistenza alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / demolizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia



Committente: Comune di Potenza Picena (MC)
Obgetto dell'intervento: Costruzione nuova scuola primaria situata tra via Piemonte e via Lombardia
Importo dei lavori: € 5.390.000,00
Classi e categorie: E.08 - S.04 - IA.02 - IA.03
Periodo di esecuzione del servizio: 03/2018 - 06/2018
Ruolo svolto nei team: Assistenza alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / demolizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia



Committente: Provincia di Vicenza
Obgetto dell'intervento: Lavori di ampliamento dell'istituto "Garbin" di Thiene (VI)
Importo dei lavori: € 3.552.800,00
Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP
Periodo di esecuzione del servizio: 02/2020 - 11/2020
Ruolo svolto nei team: Capoprogetto interno, Prog. architettonica
Tematiche: nzeb / verificato CAM / intervento sostenibile / spazi liberi / accessibilità / polo scolastico / didattica innovativa / sostenibilità edilizia



Committente: Comune di Cherasco (CN)
Obgetto dell'intervento: Realizzazione nuova scuola primaria di due sezioni e palestra
Importo dei lavori: € 5.231.837,25
Classi e categorie: E.08 - E.12 - S.04 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP (scuola) ; PP - PD - PE - CSP - DL - CSE (palestra)
Periodo di esecuzione del servizio: 06/2014 - 02/2019 (scuola); 05/2017 - 04/2019 (palestra)
Ruolo svolto nei team: Assistenza alla progettazione



Committente: Centrale unica di committenza CUC "Area Vasta Brescia"
Obgetto dell'intervento: Realizzazione della nuova scuola primaria di Borgosatollo (BS)
Importo dei lavori: € 5.660.000,00
Classi e categorie: E.08 - S.06 - IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04
Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE - DL
Periodo di esecuzione del servizio: 04/2020 - 2021
Ruolo svolto nei team: Coordinamento e Progettazione in fase di gara. Supervisione concept in fase di progetto
Tematiche: nzeb / verificato CAM / sostituzione edilizia / materiali naturali e sostenibili / legno / paglia / bioedilizia / sostenibilità / accessibilità



Committente: Comune di Cavriana (MN)
Obgetto dell'intervento: Realizzazione nuovo polo scolastico polifunzionale
Importo dei lavori: € 4.000.000,00
Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: PD - PE - CSP - DL - CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 08/2020 - 10/202 - DL in corso
Ruolo svolto nei team: Assistenza alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / demolizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia



Committente: S.U.A. Lecco - Provincia di Lecco
Obgetto dell'intervento: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Via Mirasole. Olgiate Molgora (LC)
Importo dei lavori: € 2.839.130,39
Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: PFE - PD
Periodo di esecuzione del servizio: 04/2020 - 2024
Ruolo svolto nei team: Assistente alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / sostituzione edilizia / materiali naturali e sostenibili / legno



Committente: Comune di Castiraga Vidardo (LO)
Obgetto dell'intervento: Realizzazione di scuola primaria con palestra
Importo dei lavori: € 6.596.617,39
Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: DL - CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 07/2020 - in corso
Ruolo svolto nei team: Assistenza alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / demolizione e ricostruzione durante l'anno scolastico / XLAM / bioedilizia



Committente: Comune di Dossena (BG)
Obgetto dell'intervento: Ricostruzione della scuola materna e primaria F. Alcarini e ampliamento per realizzazione di parcheggio e palestra
Importo dei lavori: € 1.360.000,00
Classi e categorie: E.08 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
Prestazioni: DEF-ES, DL, CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 03/2020-10/2020. DL: in corso
Ruolo svolto nei team: Assistente alla progettazione
Tematiche: nzeb / verificato CAM / sostituzione edilizia / materiali naturali e sostenibili / legno



arch. **M. VALENTE**
socio di **Settanta7 s.r.l.**
O.A. di TO n°10087 dal
2018

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 2016 con Tesi di Laurea di progettazione architettonica e sperimentazione sociale dal titolo "UrbanSpace 3.0: Shaping common space".

Durante il suo periodo formativo ha frequentato diversi workshop nell'ambito della rigenerazione urbana e progettazione partecipata ed inclusiva.

Valutata meritevole di pubblicazione dal Politecnico di Torino.

Tesi e lavoro di ricerca presentato ed esposto alla Biennale dello spazio pubblico 2017, Università di Roma, facoltà di Architettura Roma tre.

Abilitato all'esercizio della professione in data 21/02/2018

Iscritto all'ordine degli architetti di Torino al n. 10087 dal 2018.

Nel 2017 inizia a collaborare con Settanta7 Studio Associato e successivamente con Settanta7 srl fino a diventare socio nel 2022.

Negli anni ha svolto diversi ruoli all'interno della struttura, maturando molte competenze trasversali, fino a diventare Project Owner per il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta e la Lombardia.

SOFT SKILL:

Creativo / Organizzato / Lavoro di squadra / problem solving /



Committente: Università degli Studi di Padova (PD)
Oggetto dell'intervento: Nuova scuola di ingegneria - HUB dell'innovazione dell'Università di Padova (PD)

Importo dei lavori: € 15.000.000,00
Classi e categorie: E.10
Prestazioni: PD - PE - CSP - DL -

CSE
Periodo di esecuzione del servizio: 06/2020 - in corso
Ruolo svolto nel team: Responsabile discip. arch.
Tematiche: nzeb / leed Platinum / verificato CAM / giardini pensili / riuso strutture esistenti / ventilazione / costruire sul costruito



Committente: Provincia di Biella (BI)
Oggetto dell'intervento: Realizzazione della nuova scuola secondaria di secondo grado - area "EX ATAP" in Biella

Importo dei lavori: € 10.000.000,00
Classi e categorie: E.10
Prestazioni: PFTE - PD - PE - CSP -

Periodo di esecuzione del servizio: 10/2019 - 02/2020
Ruolo svolto nel team: Responsabile discip. arch.
Tematiche: nzeb / leed / verificato CAM / palestra CONI / bioclimatica / istituto per scienze agrarie e alberghiera / giardini pensili



Committente: Comune di San Martino di Lupari (PD)
Oggetto dell'intervento: Costruzione del nuovo polo scolastico

Importo dei lavori: € 4.236.404,97
Classi e categorie: E.08
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP - DL - CSE

Periodo di esecuzione del servizio: 11/2019 - 04/2020 (prog)
Ruolo svolto nel team: Responsabile discip. arch.
Tematiche: nzeb / LEED golden / verificato CAM / edificio in XLAM / solo materiali EPD / modellazione in regime dinamica / bassissimi consumi energetici / frangisole



Committente: Comune di Prato (PO)
Oggetto dell'intervento: Nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e palestra Pier Cironi

Importo dei lavori: € 8.361.210,00
Classi e categorie: E.08
Prestazioni: PD - PE - CSP
Periodo di esecuzione del servizio:

12/2020 - in corso
Ruolo svolto nel team: Responsabile discip. arch.
Tematiche: nzeb / verificato CAM / intervento sostenibile / green HUB / spazi liberi / accessibilità / polo scolastico / didattica innovativa / sostenibilità edilizia / scuola nel verde



Committente: Comune di Cuornè (TO)
Oggetto dell'intervento: Scuola secondaria di primo grado G. Cena - sostituzione edilizia

Importo dei lavori: € 6.243.550,00
Classi e categorie: E.08
Prestazioni: PD - PE - CSP - DL -

CSE - supporto al RUP
Periodo di esecuzione del servizio: 2019 - in corso
Ruolo svolto nel team: Responsabile discip. arch.
Tematiche: nzeb / certificabile LEED / verificato CAM / ventilazione naturale / frangisole / materiali sostenibili / sostituzione edilizia



Arch. G. CARDINALE
Co-Founder GPA
 Ordine degli Ingegneri di
 Arezzo n°339 dal 1977

Laureato in Ingegneria civile presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze.

Specializzato nella progettazione di opere pubbliche, nel coordinamento di grandi progetti, nel Project Management e nella Direzione lavori, con una particolare attenzione alle nuove tecnologie.


È membro di ICE Institution of Civil Engineers di Londra.

Professore a contratto di Tecnica delle Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, ex Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo ed ex Presidente della Federazione Regionale degli Ingegneri della Toscana. Dal 2011 componente del Consiglio Nazionale Ingegneri.


Dal 2016 è Vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri di Roma e dal 2018 è Membro dell'Executive Board di FEANI (European Federation of National Engineering Associations).

SOFT SKILL:

Ascolto / Comunicazione / Rapporti interpersonali / Problem Solving / Spirito di iniziativa / Affidabilità / Flessibilità



Commititante: Agenzia del Demanio Toscana e Umbria
 Oggetto dell'intervento: Rifunzionizzazione ex Caserma Quarters, Sesto Fiorentino (FI)
 Importo dei lavori: € 1.450.000,00
 Classi e categorie: E.20 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
 Prestazioni: PD - PE - CSE - DL
 Periodo di esecuzione del servizio: 2018 - in corso
 Ruolo svolto nel team: progettista impiantistico in ambito elettrico e speciale
 Tematiche: nzeb / verificato CAM / bioarchitettura / didattica innovativa / studio orientamento



Commititante: Privato
 Oggetto dell'intervento: Spazio espositivo commerciale e direzionale sede Prada in Galleria Vittorio Emanuele II di Milano
 Importo dei lavori: € 1.726.000,00
 Classi e categorie: E.22
 Prestazioni: PP - PD - PE - CSE - DL - CSE - CSP - BIM Management
 Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015
 Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
 Tematiche: riqualificazione / impianti innovativi / design / riutilizzo strutture esistenti / BIM Management



Commititante: Privato
 Oggetto dell'intervento: Rifunzionizzazione edificio "Ex Pastificio", Monteverarchi (AR) edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004
 Importo dei lavori: € 3.125.003,16
 Classi e categorie: S.06
 Prestazioni: Rilievo, Indagini diagnostiche in situ e lab., Valutazione sicurezza, Indirizzi operativi per il miglioramento sismico
 Periodo di esecuzione del servizio: 01-03/2017
 Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
 Tematiche: riqualificazione / valorizzazione / miglioramento sismico



Commititante: Comune di Cavriglia (AR)
 Oggetto dell'intervento: Museo della Memoria, Vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni (AR)
 Importo dei lavori: € 768.917,00
 Classi e categorie: E.22 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03
 Prestazioni: PD - PE - CSE - DL
 Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015
 Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
 Tematiche: ampliamento / impianti innovativi / valorizzazione / memoria storica / dialogo antico e nuovo



Commititante: Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d'Aosta
 Oggetto dell'intervento: Caserma Cesare Battisti-Palazzina Musso, Torino (TO)
 Importo dei lavori: -
 Classi e categorie: S.04 - E-22
 Prestazioni: Valutazione della sicurezza strutturale - Vulnerabilità sismica
 Periodo di esecuzione del servizio: 11/2017 - 06/2018
 Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
 Tematiche: rispetto del preesistente / efficientamento / riqualificazione / valorizzazione



ing. **P. SPINELLI**
Dir. Tecnico di GPA s.r.l.
Ordine degli Ingegneri di Prato n°207 dal 1993

Laureato in Ingegneria civile presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze.

Specializzato nella progettazione di opere pubbliche seguendo in particolar modo il coordinamento delle diverse competenze e professionalità nel campo dell'ingegneria strutturale.

Esperto nella progettazione di strutture in muratura, calcestruzzo armato, acciaio e legno. Progettista di interventi di consolidamento di costruzioni esistenti, anche vincolati.


Sviluppata esperienza nell'analisi ed interpretazione delle indagini strutturali e prove di laboratorio finalizzate all'analisi diagnostica delle strutture.

Professore a riposo di "Tecnica delle Costruzioni" e "Progetto e riabilitazione strutturale" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze.

Dal 2018 è anche Direttore del CRIACIV Centro di Ricerca interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del vento.


SOFT SKILL:

Creatività / Leadership / Specializzazione / Flessibilità / Memoria fenomenale / Multitasking / Carisma / Multipotenziale / Problem solving



Committente: Florida State University-Programs Association Inc.
Oggetto dell'intervento: Campus Americano Florida State University in Firenze (FI)
Importo dei lavori: € 5.058.000,00
Classi e categorie: E-22 - E-18 - S.06 - IA.01 - IA.02 - IA.04

Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE - DL
Periodo di esecuzione del servizio: 07/2018- 10/2020
Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
Tematiche: restauro /adeguamento alla normativa antincendio / memoria storica / efficientamento



Committente: Privato
Oggetto dell'intervento: Spazio espositivo commerciale e direzionale sede Prada in Galleria Vittorio Emanuele II di Milano

DL - CSE - CSP - BIM Management
Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015
Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
Tematiche: riqualificazione / impianti innovativi / design / riutilizzo strutture esistenti / BIM Management

Importo dei lavori: € 1.726.000,00
Classi e categorie: E.22
Prestazioni: PP - PD - PE - CSP -



Committente: Privato
Oggetto dell'intervento: Rifunionalizzazione edificio "Ex Pastificio", Monteverchi (AR) edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

gnostiche in situ e lab., Valutazione sicurezza, Indirizzi operativi per il miglioramento sismico
Periodo di esecuzione del servizio: 01-03/2017
Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
Tematiche: riqualificazione / valorizzazione / miglioramento sismico


Importo dei lavori: € 3.125.003,16
Classi e categorie: S.06
Prestazioni: Rilievo, Indagini dia-



Committente: Comune di Cavriglia (AR)
Oggetto dell'intervento: Museo della Memoria, Vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni (AR)

Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE - DL
Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2015
Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
Tematiche: ampliamento / impianti innovativi / valorizzazione / memoria storica / dialogo antico e nuovo

Importo dei lavori: € 768.917,00
Classi e categorie: E.22 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03



Committente: Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d'Aosta
Oggetto dell'intervento: Caserma Cesare Battisti-Palazzina Musso, Torino (TO)

curezza strutturale - Vulnerabilità sismica
Periodo di esecuzione del servizio: 11/2017 - 06/2018
Ruolo svolto nel team: Progettista strutturale
Tematiche: rispetto del preesistente / efficientamento / riqualificazione / valorizzazione

Importo dei lavori: -
Classi e categorie: S.04 - E-22
Prestazioni: Valutazione della si-



Ing. M. CECCONI
Dir. Tecnico di GPA s.r.l.
Ordine degli Ingegneri di
Firenze n°4188 dal 2000


Ingegnere civile con più di 20 anni di esperienza, si è unito a GPA nel 2001 diventando Direttore Tecnico nel 2012. Da anni è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e direzione lavori-strutturale e impiantistica, ha svolto inoltre attività di project management per numeri progetti di stabilimenti industriali, ospedali, e uffici.

Coordina con successo il gruppo di GPA dedicato allo svolgimento di tutti i lavori per la Nuova pignone General Electric, che segue personalmente dal 2012.

Tecnico abilitato al rilascio di certificazioni per la prevenzione In-cendi.

Tecnico abilitato come Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in sicurezza.

SOFT SKILL:
 Precisione / Organizzazione / Lavoro di squadra / Problem Solving / Specializzato



Committeente: Tenuta Di Castellofalfi
 Spa
 Oggetto dell'intervento: Nuovo Wellness Hotel Castellofalfi, Montaione (FI)
 Importo dei lavori: € 27.000.000,00
 Classi e categorie: E.04-S.03-IA.02-IA.04
 Prestazioni: PD - PE - CSP - CSE -DL
 Periodo di esecuzione del servizio: 2014 - 2017
 Ruolo svolto nel team: Project manager, Direttore operativo Opere Impiantistiche e OO.UU.
 Tematiche: restauro / adeguamento alla normativa antincendio



Committeente: Ferragamo
 Oggetto dell'intervento: Nuovo Polo Logistico Ferragamo, (FI)
 Importo dei lavori: € 44.000.000,00
 Classi e categorie: E.02-E.17-S.04-IA.01-IA.02
 Prestazioni: Project management generale, direzione lavori generale,
 direzione lavori specialistica delle opere strutturali e impiantistiche e delle Opere di Urbanizzazione
 Periodo di esecuzione del servizio: 2017 - 2019
 Ruolo svolto nel team: Project Manager, Coordinatore dell'Ufficio Direzione Lavori, Direttore lavori opere strutturali e impiantistiche



Committeente: Ferragamo
 Oggetto dell'intervento: Edificio M: Reparti Produttivi E Archivi Unificati Ferragamo, Sesto Fiorentino (FI)
 Importo dei lavori: € 5.000.000,00
 Classi e categorie: E.02-E.18-S.04-IA.02-IA.04
 Prestazioni: Progettazione definitiva, progettazione esecutiva strutt-
 ture ed impianti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Project Management
 Periodo di esecuzione del servizio: 2018-2019
 Ruolo svolto nel team: Project Manager, Direttore Lavori operativo strutture e impianti



Committeente: Nuovo Pignone General Electric
 Oggetto dell'intervento: Stabilimento Produttivo Nuovo Pignone General Electric, Massa Carrara
 Importo dei lavori: € 4.000.000,00
 Classi e categorie: E.02-S.04-IA.02-IA.04
 Prestazioni: Progettazione strutt-
 ture ed impianti, Direzione Lavori, Direzione Lavori Specialistica strutturale
 Periodo di esecuzione del servizio: 2015 - 2017
 Ruolo svolto nel team: Direttore Lavori generale e operativo strutture e impianti, CSE



Committeente: Monastero di Chung Tai Chan Ornlus Italia
 Oggetto dell'intervento: Nuovo Centro Culturale Buddista, Campi Bisenzio
 Importo dei lavori: 24.000.000,00 €
 Classi e categorie: E.13-S.06-IA.02-IA.04
 Prestazioni: Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, architettonica, strutturale ed impiantistica, CSE, Direzione Lavori
 Periodo di esecuzione del servizio: 2018 - in corso
 Ruolo svolto nel team: Progettista antincendio

Arch. **M. GESTRI**

Dir. Tecnico di GPA s.r.l.
Ordine degli Ingegneri di Prato n°757 dal 1998

Laureato in Ingegneria civile nel 1998, dapprima consulente esterno di GPA, nel 2013 fonda, insieme al collega Andrea Giunti, GPA Energy, società satellite di GPA S.R.L. specializzata nella progettazione impiantistica.


Dal 2022 acquisisce anche il ruolo di Direttore Tecnico di GPA. Grazie alle esperienze maturate in oltre 20 anni di carriera, Matteo Gestri è in grado di trattare i temi legati alla progettazione di impianti elettrici, meccanici e speciali con disinvoltura e competenza.

Questo grazie ad una casistica di intervento molto ampia, ovvero riferita a contesti pubblici e privati con caratteristiche tra loro differenti.



Committente: Lendlease S.r.l
Oggetto dell'intervento: Area Mind West Gate - Lott 7- Plot 4.4 Mind Milano Innovation District Rho Fiera
Importo dei lavori: 51.000.000 €
Classi e categorie: E.10- S.03-IA.01-IA.02-IA.03
Prestazioni: Progetto definitivo

strutture, impianti, Coordinamento generale
Periodo di esecuzione del servizio: 2021 - in corso
Ruolo svolto nel team: Progettista impianti
Tematiche: restauro /adeguamento alla normativa antincendio / memoria storica / efficientamento



Committente: Provincia di Lucca
Oggetto dell'intervento: Nuovo Polo Tecnologico "E. Fermi-Giorgi" (LU)
Importo dei lavori: 11.000.000 €
Classi e categorie: E.08-S.04-IA.01-IA.02-IA.03
Prestazioni: Progetto esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico, Progetto BIM integrato,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo di esecuzione del servizio: 2021- 2022
Ruolo svolto nel team: Progettista impianti
Tematiche: riqualificazione / impianti innovativi / design / riutilizzo strutture




Committente: Marco Casamonti & Partners
Oggetto dell'intervento: Nuovo Centro Sportivo "Acf Fiorentina" (FI)Importo dei lavori: € 48.000.000
Classi e categorie: E.03-E.12-E.13-S.03-S.04-S.06-IA.01-IA.02-IA.04Prestazioni: Progetto definitivo opere strutturali ed im-

piantistiche, Progetto esecutivo opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, Direzione lavori opere progettate
Periodo di esecuzione del servizio: 2018 - in corso
Ruolo svolto nel team: Progettista impianti
Tematiche: riqualificazione



Committente: Toscana Aeroporti S.r.l
Oggetto dell'intervento: Nuovo Terminal Passeggeri Aeroporto Di Pisa "Galileo Galilei" (FI)
Importo dei lavori: 20.000.000 €
Classi e categorie: E.02-V.03-S.04- IA.02-IA.04

Prestazioni: Progettazione esecutiva opere architettoniche
Periodo di esecuzione del servizio: 2019 - in corso
Ruolo svolto nel team: Progettista impianti
Tematiche: ampliamento / impianti innovativi / valorizzazione / memoria storica / dialogo antico e nuovo




Committente: Archea Associati
Oggetto dell'intervento: Nuovo Centro Termale E Di Benessere A Ponte Di Legno (BS)
Importo dei lavori: 24.250.000 €
Classi e categorie: E.04-S.06-IA.01-IA.02-IA.04
Prestazioni: Progetto esecutivo

strutturale ed impiantistico, Progetto BIM integrato I GPA
Periodo di esecuzione del servizio: 2017 - in corso
Ruolo svolto nel team: Progettista impianti
Tematiche: rispetto del preesistente / efficientamento / riqualificazione / valorizzazione

SOFT SKILL:

Multitasking / Carisma / Multipotenziale / Problem solving

IS.E. CERT. S.R.L. Unipersonale
Italia - 80024 Cardito (Na) - Via Pietro Donadio, 260
Tel. 081.842.59.15 e Fax 081.842.68.36 - info@isecert.it - www.isecert.it - isecertsrl@legalmal.it
C.F. e P.IVA 04315231219 Capitale Sociale € 91.000 int. Vers. - Iscritta presso la CCIAA di Napoli con n° 04315231219



SCM 003 A
Membro degli Accordi di Riconoscimento
EN, AF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements




Referirsi al Manuale Qualità dell'Organizzazione o documentazione equivalente per i dettagli dei processi non applicabili e relativi ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e per i processi affidati in outsourcing.
La validità del presente Certificato è subordinata ad un programma di sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.
Il presente certificato è soggetto alle disposizioni IS.E. Cert per la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i recapiti riportati a piè di pagina.
The validity of this Certificate is subordinated to a yearly surveillance program and to a complete review of the management system every three years.
This certificate satisfies the IS.E. Cert requirements for certification of Quality Management System.
For information on time and up to date about any changes in the state of the certification referred to in this certificate, please contact the addresses listed at the bottom of the page.

CERTIFICATO N°	3896
DATA DI PRIMA EMISSIONE	2021.11.11
FIRST ISSUE DATE	2021.11.11
DATA EMISSIONE CORRENTE	2021.11.11
CURRENT ISSUE DATE	2021.11.11
DATA DI SCADENZA	2024.11.10
EXPIRY DATE	2024.11.10



CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE BODY
CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
SETTANTA 7
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
C.F. 12396810017
Sede Operativa: Italia - 20159 Milano (Mi) - Via Valassina, 23
Sede Operativa: Italia - 10144 Torino (To) - Via Principessa Clotilde, 3
Sede Legale: Italia - 10121 Torino (To) - Corso Re Umberto, 13 MAT Srl
È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO BE IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD
UNI EN ISO 9001 ED. 2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ AVENTI COME OGGETTO
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES HAVING AS OBJECT
Progettazione in ambito edile.
SETTORE DI ACCREDITAMENTO IAF
ACCREDITATION SECTOR
34





CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
CERT-05020-99-AQ-FLR-SINCERT

Data Prima Emissione:
13 ottobre 1999

Validità:
07 dicembre 2021 – 05 dicembre 2024
Data di scadenza dell'ultimo ciclo di certificazione:
05 dicembre 2021
Data dell'ultima ricertificazione:
12 novembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

GPA S.r.l. - Sede Legale

Via G. da San Giovanni, 87 - 52027 San Giovanni Valdarno (AR) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, direzione lavori, project management per opere di ingegneria civile, ingegneria ambientale e di architettura (IAF 34)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 07 dicembre 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 004 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SQQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GIG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SQQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MLA TL/C per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) -
Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905 - www.dnv.it



Certificato n.: CERT-05020-99-AQ-FLR-SINCERT
Luogo e Data: Vimercate (MB), 07 dicembre 2021

Appendice al Certificato

GPA S.r.l. - Sede Legale

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito	Indirizzo del sito	Scopo del Sito
GPA S.r.l. - Sede operativa	Via Leone X, 3 - 50129 Firenze (FI) - Italia	Riferimento al campo applicativo
GPA S.r.l. - Sede Legale	Via G. da San Giovanni, 87 - 52027 San Giovanni Valdarno (AR) - Italia	Riferimento al campo applicativo

CRITERIO B

Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunte dai servizi analoghi svolti



Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio tecnico di redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori, realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado.



RTP
Settantaz7 s.r.l. GPA s.r.l.

Indice


NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN)
PP. 01-02




SERVIZIO 1

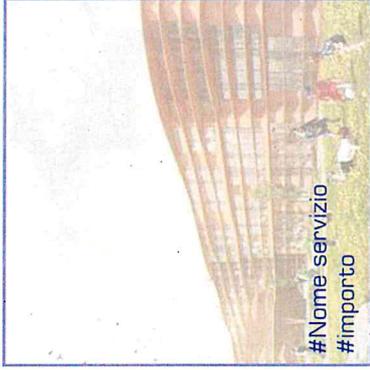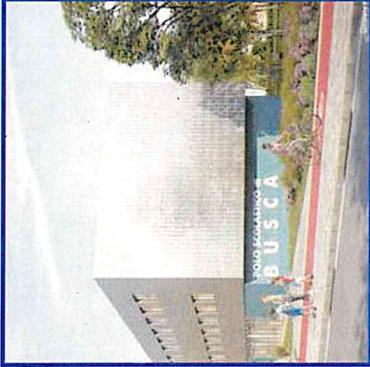


#Nome servizio
#Importo

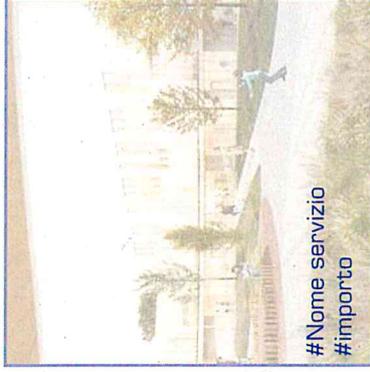



#Nome servizio
#Importo

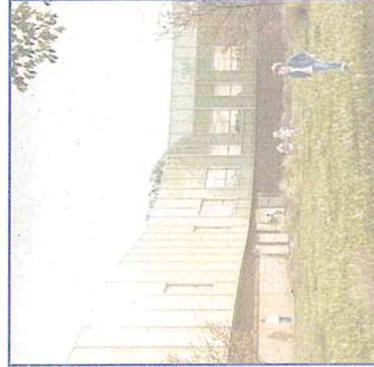


NUOVA SCUOLA "R. SANZIO" A PORTO PICENZA (MC)
PP. 01-02

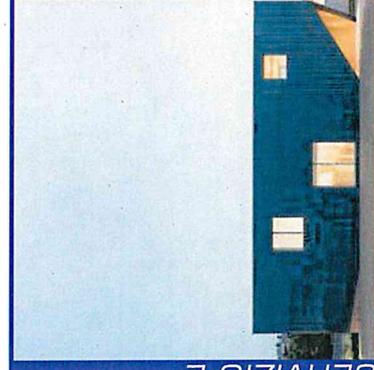


SERVIZIO 2

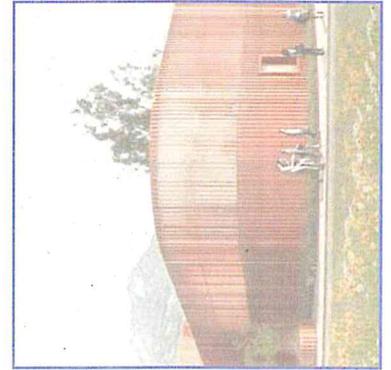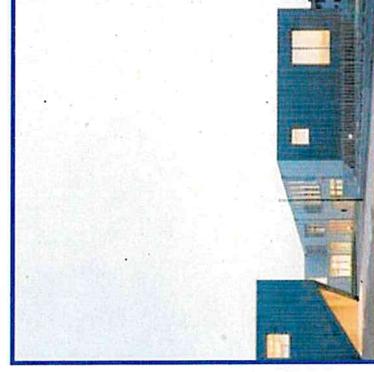

NUOVA SCUOLA SANTALESSANDRO DI CARONNO PERTUSELLA (VA)
PP. 01-02

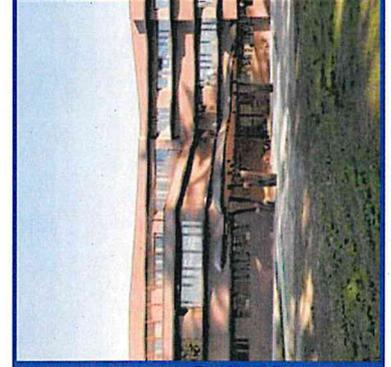


SERVIZIO 3

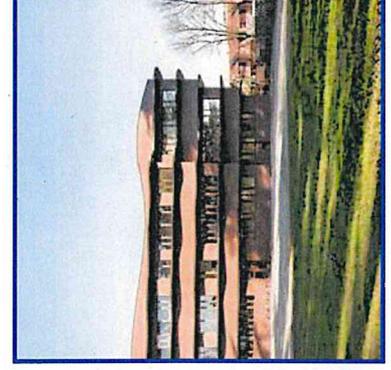

B.1 Nuovo polo di Busca, Scuola primaria e secondaria

nel comune di Busca (CN)

Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra **interventi qualificabili affini sul piano architettonico**.

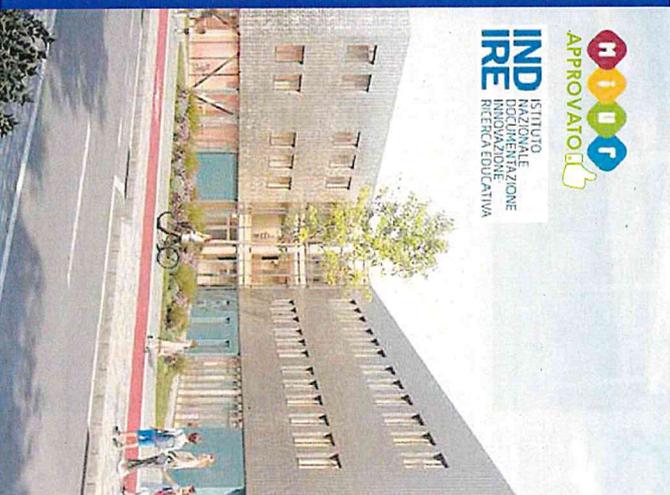


Classe e categorie	E.1/D	I/d	1,20	€3.343.742,03
	S.04	IX/b	0,90	€1.033.376,31
	S.03	I/g	0,95	€1.092.081,56
	IA.01	III/a	0,75	€303.661,27
	IA.02	III/b	0,85	€1.081.549,81
	IA.03	III/c	1,15	€824.262,66
	IA.04	III/e	1,30	€71.326,37
PTE e PD_CSP Assistenza pratica per l'accesso al finanziamento MIUR / S7				
In qualità di soggetto unico con incarico integrale (100%) PE, DL, CSE, Misurazione e contabilità, Assistenza al collaudo e coordinatore delle prestazioni, /S7 (49%) in RTP in qualità di capigruppo con Telco s.r.l. e Anasidi studio associato.				
Ruolo svolto nel servizio	Nuovo polo scolastico, scuola primaria e secondaria di primo grado di Busca			
Committente	Comune di Busca (CN)			
Importo lavori	€ 7.750.000,00			
Importo del servizio	€ 158.921,79			
Periodo prestazione	progettazione 2020			
DL in corso	PTE	SI		
Livello pro-gettazione	PD	SI		
	PE	SI		
DL	SI			
CSP	SI			
CSE	SI			
Opera Realizzata	In corso			

Soluzioni architettoniche
 Nell'elaborazione del polo scolastico abbiamo adottato un **principio progettuale** multiscala, dalla dimensione urbana a quella architettonica, fino alla definizione degli spazi interni. L'inserimento nel contesto del nuovo polo scolastico è stato **indirizzato dalle forti preesistenze legate alla vicinanza del centro storico cittadino**. L'area si pone in una posizione strategica come **cerniera tra il centro storico e l'area di sviluppo urbanistico novecentesco**, offrendo un luogo di fruizione pubblica aperto all'intera comunità locale, con gli spazi multifunzionali del "civic center", che abbiamo collocato al piano terra, e le aree esterne di pertinenza della scuola. Abbiamo disposto i volumi e pensato agli spazi e ai percorsi all'interno dell'area in modo tale che si integrino, in modo coerente ed armonioso, con il contesto urbano consolidato, per valorizzarne i principali aspetti paesaggistici e stabilire un rapporto continuo, coerente e sostenibile con l'esistente. Il fabbricato ha uno sviluppo longitudinale a forma di X, con andamento curvilineo in planimetria. **Si articola su tre livelli ed è disposto**


coerentemente con la conformazione del lotto in cui andrà a inserirsi, come anche il nuovo volume della palestra, in dialogo con il contesto urbano circostante. Attraverso l'interconnessione dei due corpi longitudinali curvilinei, si viene a creare un impianto che risulta essere, soprattutto al piano terra, caratterizzato da ampi spazi vetrati, i quali facilitano la permeabilità con l'ambiente esterno, ed ospita al suo interno vari spazi polifunzionali, attività di laboratorio, oltre che spazi terrazzati. Le aree verdi esterne sono concepite come uno spazio filtro tra il contesto urbano e la scuola, diventando luogo per la didattica open air e spazio di incontro tra la comunità scolastica e quella cittadina. Durante la progettazione il team di progetto ha utilizzato come linee guida quelle espresse dal **protocollo leaca** per gli edifici scolastici.

Esplosio funzionale

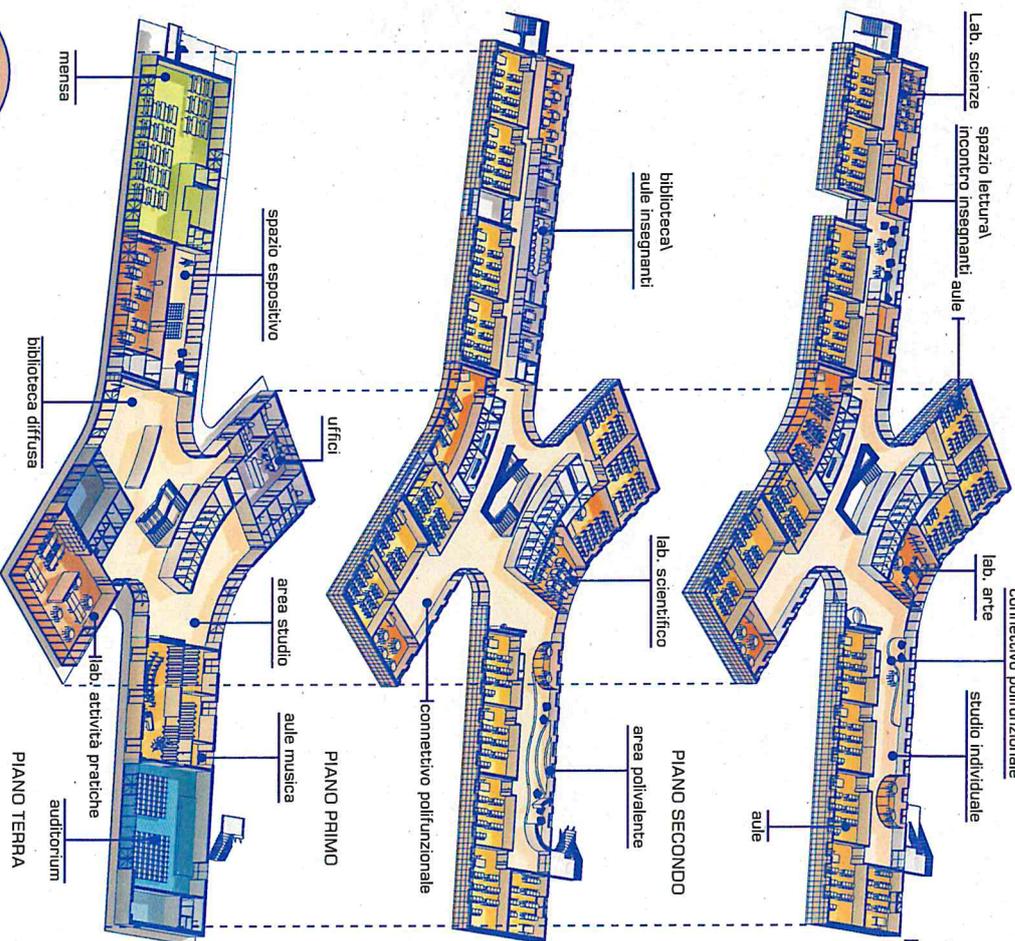

1. Il connettivo polifunzionale. L'entrata e i corridoi non sono solo spazi di transizione ma anche di sosta e di aggregazione, ambienti simbolo di scambio e interazione.

2. Aule allestite per una didattica innovativa, con dotazioni tecnologiche per una didattica smart e arredi riconfigurabili.

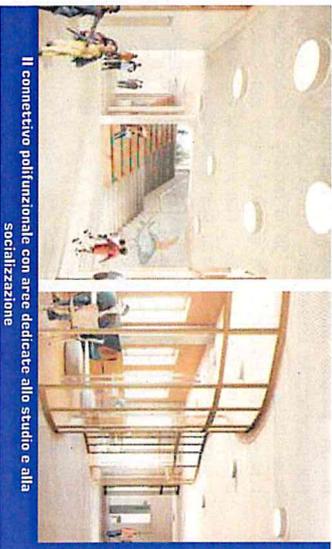

Il connettivo polifunzionale con aree dedicate allo studio e alla socializzazione



DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

CONTINUITÀ' SCOLASTICA GARANTITA

CANTIERE PULITO

CANTIERE IN PIU' FASI

Modalità di svolgimento del servizio di Direzione dei Lavori e CSE

La Direzione lavori per il nuovo polo scolastico di Busca è caratterizzato da un elevato grado di complessità di gestione delle interferenze e dei flussi interni, dovuta alla volontà di **dover usufruire sempre dei locali scolastici anche in fase realizzativa.**

Per questo motivo si è optato per la collocazione di un **plesso scolastico temporaneo** collocato nel parcheggio antistante, composto da 4 blocchi aule costituito ciascuno da 8 moduli prefabbricati. I servizi accessori sono stati ubicati nei blocchi palestra, mensa ed uffici, e raggiungibili attraverso i percorsi protetti. Inoltre, **per garantire una più**

rapida restituzione del manufatto alla comunità scolastica il cantiere è stato suddiviso in 3 sottocantieri virtuali, ognuna con una squadra di lavoro **pienamente indipendente dalle altre** e dotata di tutte le macchine, messi ed attrezzature per consentire lo svolgimento in piena autonomia di tutte le proprie attività. Infine, altro fiore all'occhiello del cantiere, è la **presenza di un laboratorio tematico sulle attività di costruzione per rendere partecipi i ragazzi alla propria scuola già in fase realizzativa.** I laboratori vertono sui temi legati a malte, strutture, materiali e sostenibilità, oltre a un tour in realtà virtuale e visite guidate in cantiere, espressione della **progettazione partecipata** firmata Settanta7.

34 VERBALI DI DL E DO

Avanzamento dei cantieri

22 VERBALI DI CSE

su più sottocantieri in parallelo, con l'impiego di tre squadre distinte

PRESENZA

COSTANTE IN CANTIERE CON VISITE QUOTIDIANE DEL D.O.

Layout di cantiere



Layout di cantiere

- Area riservata D.L.
- Area baraccamenti
- Deposito materiali
- Deposito rifiuti
- Percorsi pedonali
- Percorsi veicoli
- Area di lavorazione


Organizzazione moduli temporanei per garantire la continuità didattica



- 1 Blocco palestra
- 2 Campetto polivalente
- 3 Blocco mensa
- 4 Aule prefabbricate
- 5 Blocco uffici
- 6 Pensilina

Foto di cantiere


Foto estratta dai report fotografici del nostro Ufficio DL

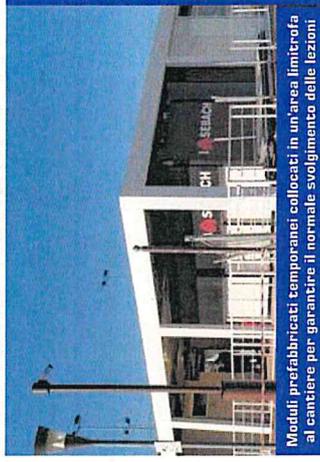

Moduli prefabbricati temporanei collocati in un'area limitrofa al cantiere per garantire il normale svolgimento delle lezioni




Realizzazione nucleo in c.a.

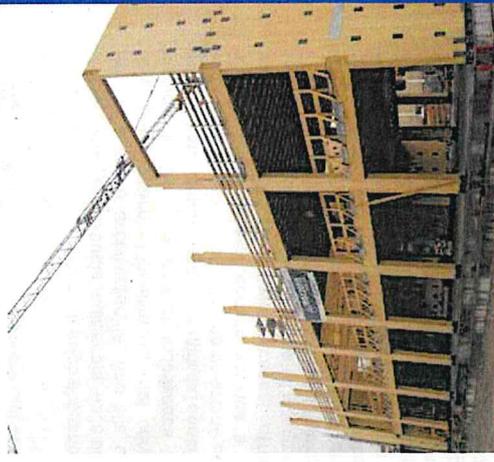

Struttura XLam, rapidità di montaggio e cantiere pulito



Struttura "mista", rapidità di montaggio e cantiere pulito

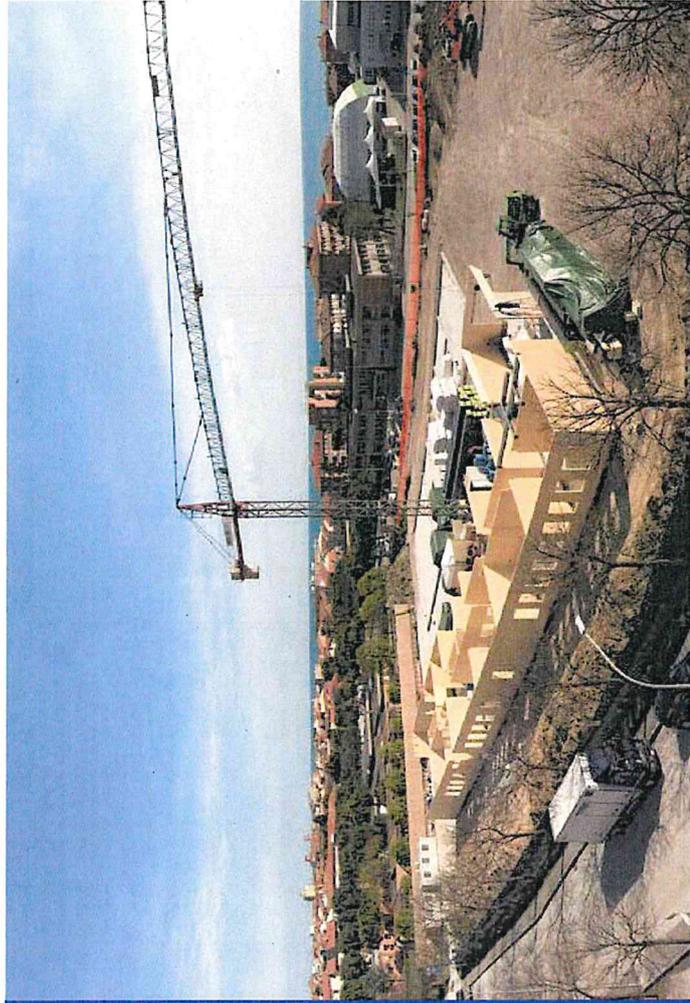

DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

Planimetria di cantiere




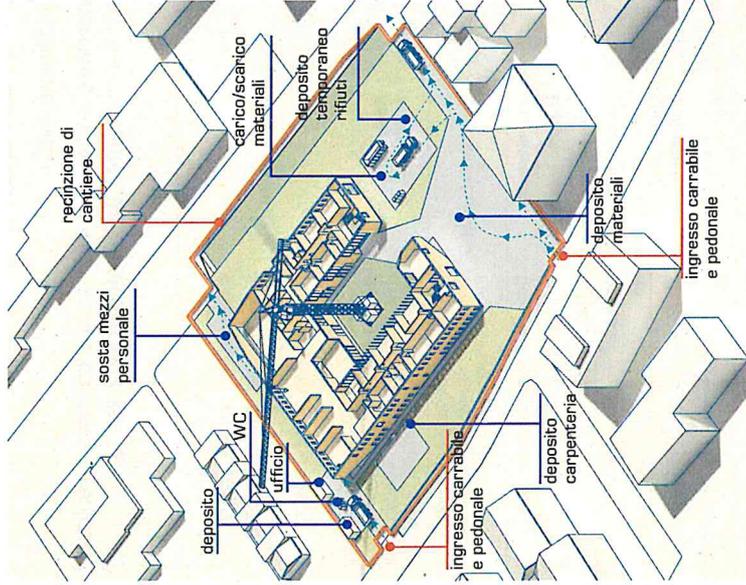


Foto di cantiere

Foto estratte dai report fotografici del nostro Ufficio DL

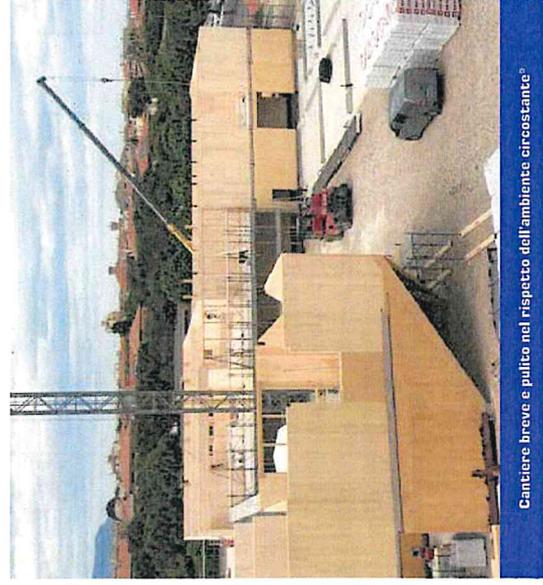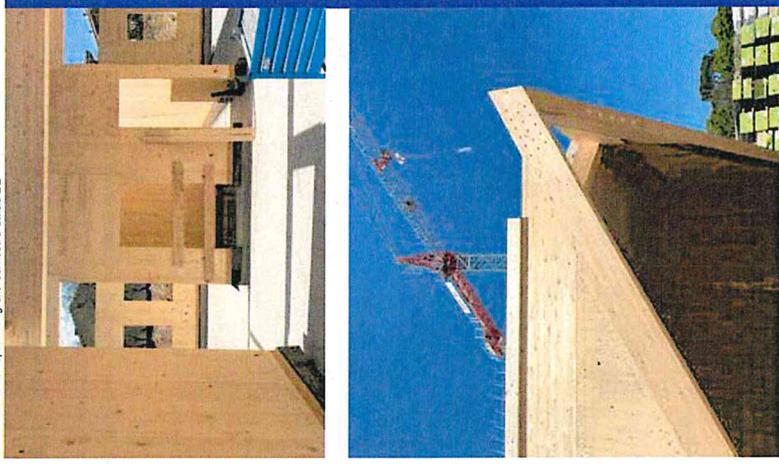

Cantiere breve e pulito nel rispetto dell'ambiente circostante

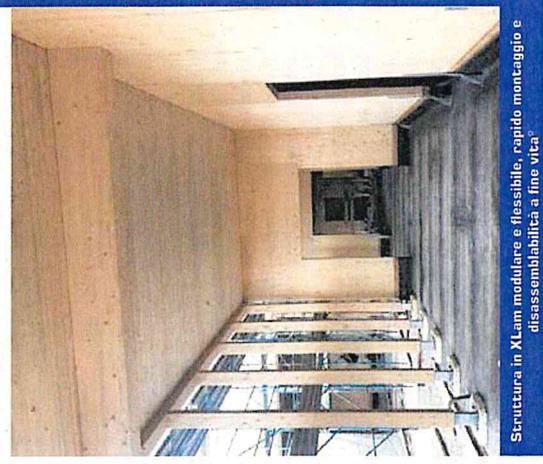

Struttura in XL-am modulare e flessibile, rapido montaggio e disasssemblabilità a fine vita

MINIMIZZAZIONE RISCHI ED INTERFERENZE

COMUNICAZIONE COSTANTE

CANTIERE BREVE E PULITO

Modalità di svolgimento del servizio di Direzione dei Lavori e CSE

Grazie alla nostra esperienza in cantieri pubblici e relativi alla realizzazione di edifici scolastici, siamo stati in grado di gestire l'esecuzione delle lavorazioni, in particolare **modo per il montaggio della struttura principale e la sicurezza in cantiere in modo efficiente** e restituire alla Stazione Appaltante un edificio di qualità. A questo proposito è stato importante dare delle indicazioni chiare e precise all'appaltatore, formalizzate grazie alla redazione di chiari e precisi verbali di cantiere. **Abbiamo organizzato il nostro Ufficio DL dedicando le risorse in funzione delle lavorazioni principali e garantendo al tempo stesso un costante monitoraggio dell'andamento del cantiere.** L'area di intervento è situata nelle immediate vicinanze della scuola media afferente allo stesso istituto comprensivo, per cui è stato fondamentale prevedere un'organizzazione

del cantiere e una gestione delle lavorazioni e della viabilità rispettosa degli utenti del limitrofo polo scolastico. Il Direttore dei Lavori, arch. Daniele Ragnone e il D.O. operativo strutturale durante le fasi di getto delle fondazioni e di montaggio della struttura principale hanno garantito una presenza costante in cantiere, verificando puntualmente la corrispondenza tra progetto esecutivo, particolari costruttivi e realizzazione in situ correndo la presenza fisica con la redazione di appositi verbali contrfirmati dall'appaltatore. Per questo il **C.S.E.**, ha messo a punto un metodo organizzativo del cantiere improntato sulla contestualizzazione dello stesso e su un principio di **comunicazione totale con tutte le maestranze.** Inoltre, l'impiego di tecnologie prefabbricate ci ha consentito di assicurare un cantiere rapido e pulito e la minimizzazione di rischi ed interferenze, con limitata produzione di polveri e rumori, compresa la riduzione degli orari di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi, e necessità di minori aree di stoccaggio grazie ad un montaggio quasi contemporaneo alla fornitura. Questa esigenza nasce dal fatto che il lotto d'intervento della scuola Raffaello Sanzio è circondato da una forte presenza di edifici residenziali a pochi metri di distanza.

22 VERBALI DI DL E DO

22 VERBALI DI CSE

PRESENZA

COSTANTE IN CANTIERE CON VISITE QUOTIDIANE DEL D.O.

B.3 Scuola primaria "S. Alessandro"

nel comune di Caronno Pertusella (VA)

Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra **interventi qualificabili affini sul piano impiantistico**

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE PROGETTUALI



Il progetto nasce dall'esigenza del Comune di ampliare la scuola di Sant'Alessandro per raddoppiare la superficie. A causa delle carenze **prestazionali dal punto di vista strutturale ed energetico**, abbiamo risposto alle esigenze dell'amministrazione realizzando un ampliamento con sopraelevazione parziale e riqualificazione dell'esistente. Abbiamo seguito tutte le fasi di progetto, curato il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori. L'intervento, in linea con le **nuove linee guida MIUR**, prevede la realizzazione di una cittadella per gli studenti contemporanea ed eco-sostenibile. La scuola, a seguito degli interventi descritti, è costituita da 20 aule didattiche, 5 aule intermedio e 4 aule per attività integrative, con spazi collettivi polifunzionali, dislocati su 3 piani fuori terra.

Principali soluzioni impiantistiche




Per rendere l'edificio nel complesso energeticamente sostenibile, oltre ad intervenire nell'isolamento dell'involucro, abbiamo previsto la suddivisione in zone termiche in base all'utilizzo dei macro-ambienti e all'orientamento. Abbiamo adottato **soluzioni impiantistiche innovative** che hanno consentito di minimizzare i consumi e i rela-

Classe e categorie	E.08 I/d 0,95	€1.844.840,59
	S.03 Ix/b 0,95	€926.723,70
	IA.01 III/a 0,75	€299.370,02
	IA.02 III/b 0,85	€419.885,29
	IA.03 III/c 1,15	€463.110,13
	E.17 I/a-b-c 0,65	€213.070,90
	Settecenta7**	Studio di
		Facilità Tecnica Economica,
		Progetto preliminare, Progetto
		Definitivo, CSP, Progetto
Ruolo svolto nel servizio		CSE, Contabilizzazione Lavori,
		Ampliamento e ristrutturazione
		della Scuola Sant'Alessandro con
		formazione di n.4 cicli completi a
		Caronno Pertusella (VA)
		Comune di Caronno Pertusella
		(VA)
Committente		
Importo lavori		€ 3.966.800,63
Importo del servizio		€ 258.188,85
Periodo prestazione		24/01/2019
	P.TE	SI
Livello progettazione	PD	SI
	PE	SI
DL	SI	SI
CSP	SI	SI
CSE	SI	SI
Opera Realizzata	SI	

tivi costi.

In particolare, nella parte in ampliamento della scuola, abbiamo realizzato i seguenti interventi:


- **Impianto termico** mediante pompe di calore condensate ad aria.
 - **Impianto di riscaldamento** per mezzo con pannelli radianti a pavimento.
 - **Impianto di ventilazione meccanica controllata** con recuperatori di calore ad alto rendimento e pompa di calore interna.
 - **Impianto fotovoltaico** in copertura di potenza nominale 33,25 kW, in grado di alimentare l'impianto elettrico dell'edificio.
 - **Impianto di illuminazione con corpi illuminanti Led ad alta efficienza**, dimmerabili e sensori di presenza e per il controllo dell'illuminazione a seconda delle attività e della quantità di luce naturale presente negli ambienti.
- Per quanto riguarda il fabbricato scolastico esistente, abbiamo adottato strategie di natura sostitutiva e migliorativa al fine di rendere completi e perfettamente funzionanti gli impianti meccanici destinati al riscaldamento e raffrescamento.

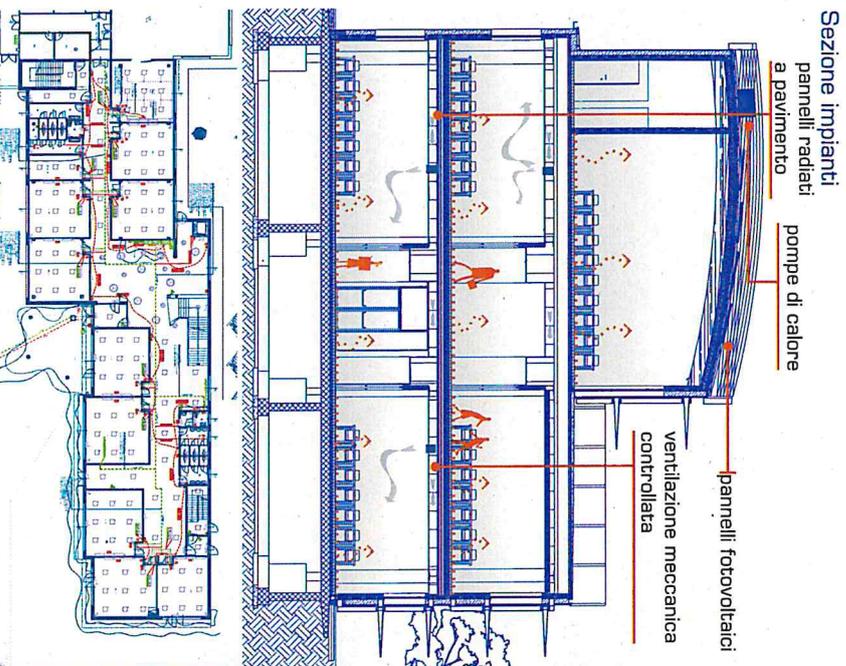


PARAMETRI ENERGETICI	
EPglr	6,24 kWh/m ²
EPglr	4,6 kWh/m ²
EPhd	14,44 kWh/m ²
Fotovoltaico	33,25 kWp 133 moduli
Classe energetica	A4 / NZEB




Pannelli radianti a pavimento

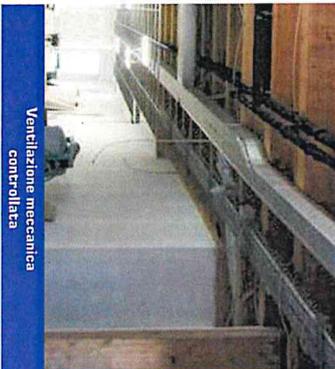


Ventilazione meccanica controllata



Installazione pompe di calore condensate ad aria

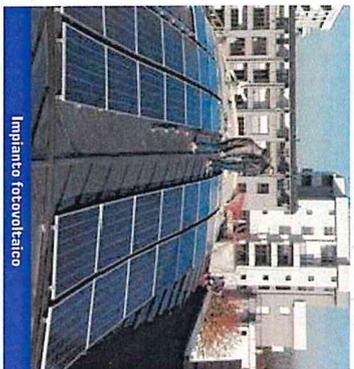

Impianto fotovoltaico

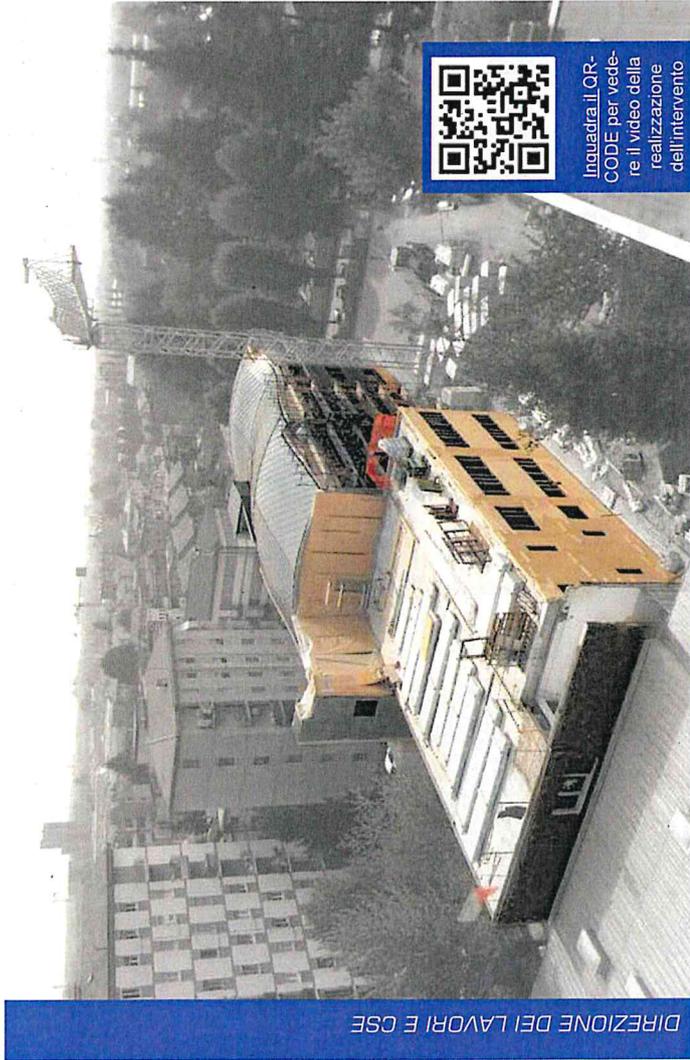

DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

Modalità di svolgimento del servizio di Direzione dei Lavori

L'• esecuzione dei lavori e di conseguenza il coordinamento della sicurezza hanno dovuto far fronte gran parte della **scuola esistente è rimasta in funzione durante tutto lo svolgimento del cantiere.** Inoltre l'area di cantiere era localizzata, in pieno centro urbano con presenza di numerose attività pubbliche limitrofe. Si è deciso per questo motivo di procedere per fasi di attuazione successive con un'accurata gestione temporale delle lavorazioni rivolta a ridurre le interferenze con il contesto e in particolare con le attività

scolastiche. Per ogni fase sono stati organizzati layout di cantiere e recinzioni adeguate alle lavorazioni, individuando di volta in volta percorsi di accesso sicuri per gli studenti, elaborando cronogrammi sempre aggiornati e puntando al massimo coordinamento con RSPP scolastico e impresa, con una condivisione digitale immediata di verbali. Inoltre al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità anche in cantiere, abbiamo individuato apposite aree per la differenziazione dei materiali di scarto quali sfidri o imballaggi in modo da poterli conferire in apposite discariche per lo smaltimento o il riciclo a seconda della loro natura. Abbiamo organizzato il nostro Ufficio **DL e CSE** dedicando le risorse in funzione delle lavorazioni principali e garantendo frequenti visite da parte di DL, DO e CSE per un costante monitoraggio dell'andamento del cantiere. Ciò ha permesso di avere una **totale conoscenza dello svolgimento delle lavorazioni e di assicurare un completo controllo in**

123 VERBALI DI DL E DO
63 VERBALI DI CSE

PRESENZA
COSTANTE IN CANTIERE CON VISITE QUOTIDIANE DEI D.O.

Planimetria del lotto

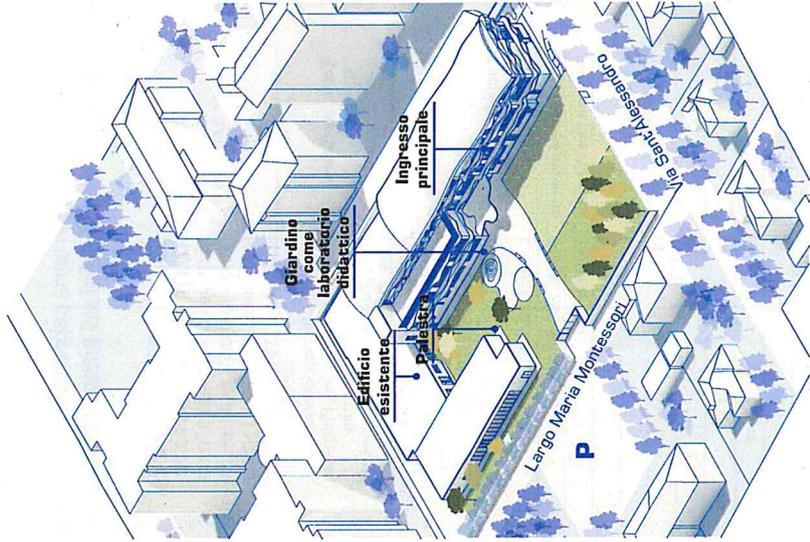


Foto di cantiere
Foto estratta dal report fotografico del nostro Ufficio DL



Sopraelevazione e rivestimento in facciata

Il cantiere si è svolto in contemporanea con le attività didattiche all'interno degli ambienti scolastici non direttamente interessati dalle lavorazioni.


Foto di cantiere
Foto estratta dal report fotografico del nostro Ufficio DL

Foto di cantiere
Foto estratta dal report fotografico del nostro Ufficio DL


Planimetria del lotto

Legenda - Fasi di cantiere


- A** Ampliamento
- B** Mensa ed Uffici
- C** Aule
- D** Palestra




- 01** - Realizzazione Ampliamento
 - area lavorazioni recintata e segnalata al fine di impedire l'accesso ai non addetti;
 - strip-out della facciata del corpo C;
 - costruzione del nuovo corpo di fabbrica dell'ampliamento A e demolizione della parete di tamponamento del corpo C in corrispondenza del collegamento;
 - completamento della facciata della prima porzione del blocco A ed insediamento della popolazione scolastica.



- 02** - Riqualificazione area mensa ed uffici
 - completamento della facciata dell'ultima porzione del blocco A con attività scolastiche già insediate all'interno;
 - consegna di tutto il corpo A;
 - demolizione della finitura della copertura in argilla espansa;
 - completamento della facciata del corpo C;
 - completamento del piano in sopraelevazione in X-LAM sopra il corpo C;



- 03** - Riqualificazione e Sopraelevazione
 - completamento della facciata del corpo C;
 - completamento del piano in sopraelevazione in X-LAM sopra il corpo C;
 - riqualificazione dell'interno del corpo C con intervento sia sulle partizioni orizzontali che su quelle verticali interne;
 - dismissione della gru.
- 04** - Finiture e Smantellamento cantiere
 - ultime finiture interne nel corpo C;
 - smantellamento del cantiere.



CRITERIO C

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA





Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio tecnico di redazione progetto esecutivo, direzione dei lavori, realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado.

RTP
Settantat7 S.r.l. GPA S.r.l

Indice : RELAZIONE METODOLOGICA

CRITERIO C
CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL'OFFERTA
PP. 01-04

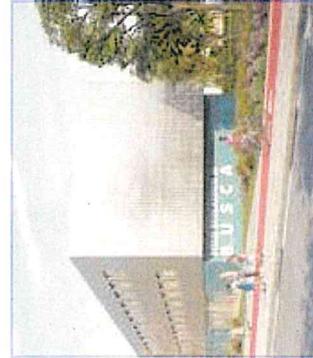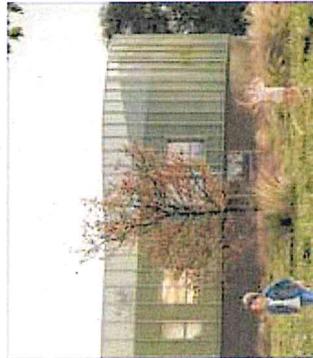

- **C.1**
Progettazione esecutiva: pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta dal punto di vista architettonico e strutturale, migliorativo rispetto al progetto definitivo nel rispetto del q.e. dell'opera
PP 01 e 02
- **C.2**
Progettazione esecutiva: pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta dal punto di vista impiantistico e di risparmio energetico, migliorativo rispetto al progetto definitivo nel rispetto del q.e. dell'opera
PP 02
- **C.3**
Direzione lavori: proposta organizzativa dell'ufficio di direzione lavori, modalità di esecuzione del servizio, costanza ed efficacia delle attività di supervisione e controllo
PP 02
- **C.4**
Direzione lavori: efficacia ed efficienza delle modalità di informazione, interazione ed integrazione con la Stazione Appaltante
PP 04
- **C.5**
Direzione lavori: capacità di aggiornamento costante degli elaborati di progetto attraverso il Building Information Modeling e consegna di elaborati aggiornati secondo cronoprogramma da definirsi con la Stazione Appaltante
PP 04
- **C.6**
Eventuali prestazioni e servizi aggiuntivi
PP 04

Sub-Criterio C1 Progettazione esecutiva: pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta dal punto di vista architettonico e strutturale, migliorativo rispetto al progetto definitivo nel rispetto del q.e. dell'opera.

Proposte **architettoniche**

migliorative - Abbiamo analizzato il progetto posto a base di gara incrociando i gli elementi progettuali con i nostri parametri interni di qualità. Le proposte che illustreremo di seguito sono per noi un importante elemento di **continuità con il progetto posto a base gara ma che al tempo stesso permettono di implementarlo sensibilmente.**

1. Ottimizzazione dei sistemi di schermatura solare

Nel progetto definitivo il sistema di schermatura solare proposto sulla facciata Sud-est dell'edificio utilizza semplici tende interne ad azionamento manuale: **questo sistema è il meno efficace contro l'irraggiamento solare e quindi poco funzionale per l'esposizione a sud est. Proponiamo di installare delle schermature esterne collegate ad un sistema di controllo BACS:** questo sistema ha un potere schermante nettamente maggiore, evitando così problemi di surriscaldamento degli ambienti interni. Inoltre il sistema di domotica BACS permette l'autoregolazione per un risparmio energetico maggiore ed un comfort interno ottimale.

2. Sistema di facciata ventilata

La finitura delle pareti perimetrali presenta pochi vantaggi in termini di prestazione termica e di resistenza meccanica oltre che di pregio. Per questo abbiamo studiato un sistema di faccia-


ta ventilata, che grazie alla presenza della camera d'aria tra l'isolante e il rivestimento, è capace di generare dei moti convettivi che migliorano la traspirabilità dell'edificio. Questo sistema garantisce una resistenza meccanica della facciata certificata, inoltre il materiale di finitura è inalienabile nel tempo a garanzia di un risultato ventennale per la Stazione Appaltante di Mozzecane.

3. Miglioramento della fruibilità interna

La nostra proposta incrementa in termini dimensionali e qualitativi lo spazio di circolazione già parzialmente previsto nel progetto a base di gara. **Una maggiore ampiezza dei corridoi garantisce una fruizione dello spazio più agevole. La nuova proposta prevede spazi per la didattica ed altre attività quindi i processi cognitivi degli studenti non costretti a luoghi chiusi ed esperienze mediate dagli schemi rigidi e inflessibili della didattica frontale.**

4. Aggiunta di una scala compartimentata.


In base alla nostra esperienza con la configurazione a base gara l'assenza di compartimentazione di una delle due scale potrebbe portare a delle criticità in fase di esame progetto VVF. Proponiamo quindi di inserire una scala esterna di emergenza o di compartimentare una delle due scale poste all'interno della scuola.

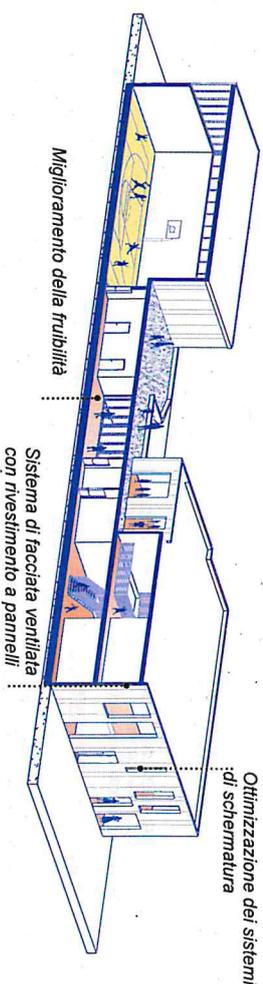

1 postazioni modulari multifunzionali



2 sedute modulari mobili



3 scaffalature modulari diffuse

Proposte strutturali migliorative

1. Sistema di fondazione procederemo con un sistema di tipo tridimensionale a platea in ca+ vespaio areato.

2. In elevazione proponiamo la pressoché totale sostituzione delle lavorazioni umide (gettate in opera) con altreccante in acciaio.


L'uso del cemento armato sarà limitato ai vani ascensore e/o scala. La struttura portante dell'edificio consisterà in un sistema intelaiato a nodi rigidi in acciaio, che sarà applicato sia agli elementi verticali (pi-

lastri) che agli elementi strutturali orizzontali (travi). **Tra l'altro, l'uso dell'acciaio consente di perseguire obiettivi di eco sostenibilità in quanto trattasi di materiale riciclabile al 100%, azione che può essere ripetuta infinite volte senza che nessuna delle sue proprietà originarie vada perduta.**

3. La palestra: realizzata con un sistema intelaiato composto da travi reticolari e solaio in xlam.

4. Proponiamo di realizzazione gli elementi di connessione verticali, le scale, in acciaio;

CRONOPROGRAMMA sintetico della Progettazione ESECUTIVA

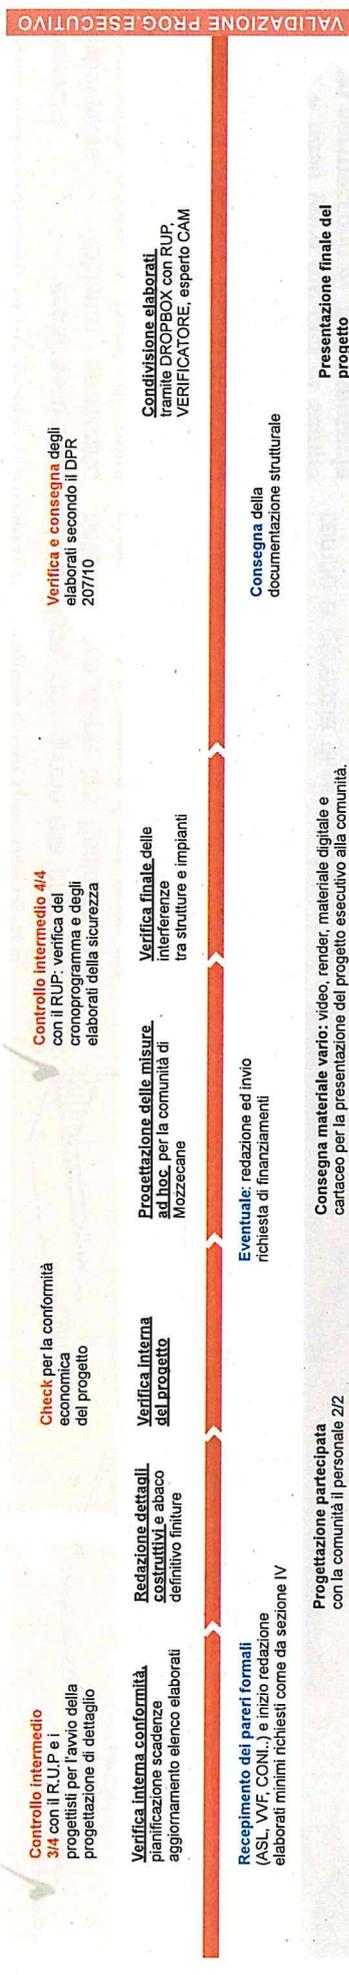

Sub-Criterio C2 Progettazione esecutiva: pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta dal punto di vista impiantistico e di risparmio energetico, migliorativo rispetto al progetto definitivo nel rispetto del q.e. dell'opera

Proposte impiantistiche migliorative

Proponiamo di implementare il progetto impiantistico nei seguenti parametri:

1. Un BACS e TBM di Classe B "HIGH ENERGY PERFORMANCE" secondo la UNI 15232 con livelli di precisione e completezza del controllo automatico che consentirà con un incremento del 10%

all'impianto di raggiungere la massima prestazione.

2. La rispondenza dal punto di vista normativa rispetto alle nuove prescrizioni D.lgs. 199/2021, pari a P=Sx0,05 con un incremento

del 10% un sistema di pannelli fotovoltaici, con una potenza minima, secondo le nuove indicazioni del D.lgs. 199/2021, pari a P=Sx0,05 con un incremento del 10%

Sub-Criterio C3 Direzione lavori: proposta organizzativa dell'ufficio di direzione lavori, modalità di esecuzione del servizio, costanza ed efficacia delle attività di supervisione e controllo

Proposta organizzativa dell'Ufficio Direzione Lavori

Il team di Settanta7 dedicato alla gestione alla DL ed al CSE è formato da professionisti che hanno esperienze eterogenee che vanno dal mondo delle imprese di costruzione, alla progetta-

zione in ambito europeo. (vedi organigramma DL)

Offriamo un regolare presidio del cantiere organizzando le visite sulla base delle competenze specialistiche dei nostri professionisti.

Garantiamo un numero di visite non

inferiore a 2 per settimana e comunque la presenza del Direttore dei Lavori e dei D.O. di settore ogni qual volta debbano essere valutate, verificate, avviate o anche solo monitorate lavorazioni particolarmente critiche e/o rilevanti per la buona riuscita dell'opera. Ad ogni visita seguiranno report descrittivi e fotografici dell'attività di cantiere per documentare il progressivo avanzamento dei lavori. Il segreto del nostro team, oltre ad un mansionario specifico per ogni membro del team, è l'organizzazione del workflow che permette un costante aggiornamento di tutte le risorse coinvolte. Il Direttore Lavori, garantirà la perfetta esecuzione dell'opera in linea con la progettazione approvata e coordinerà i rapporti con la stazione appaltante e l'impresa.

Sarà, affiancato da un team di "Site Manager" dedicato alla D.O. e dal nostro team di Back-Office che, occupandosi degli aspetti amministrativi e composto da esperti nella rendicontazione ai fini dell'acquisizione dei fi-

nanziamenti, garantirà una comunicazione snella ed efficiente tra le parti e un maggior controllo nella redazione dei documenti. I **Direttori Operativi**, suddivisi per specialità e coordinati dal Direttore dei Lavori, avranno un ruolo operativo nella redazione del giornale dei lavori, nell'organizzazione delle visite e nello scambio di documenti (verbali di sopralluogo), che potrà avvenire tramite la nostra piattaforma **Primus-Platform**. L'**Ispettore di cantiere** redigerà quasi in real time i verbali di cantiere grazie all'utilizzo di **trello**, ed insieme al DO, si occuperà dell'accettazione dei materiali.

ORGANIZZAZIONE SETTIMANA TIPO	
giorno 1	Visita DL e CSE Arch. Daniele Rangone
giorno 2	Attività back office
giorno 3	Visita D.O.
giorno 4	Attività back office
giorno 5	Attività back office

1. Riunione di coordinamento con il RUP/enti coinvolti;

2. Riunione di coordinamento DL, CSE e RUP;

L'ufficio di back office, sarà a disposizione 5/5 per aggiornamento e predisposizione di documenti contabili ed amministrativi!

Modalità di esecuzione del servizio

Strumenti utilizzati per lo scambio delle informazioni



La committenza **parteciperà attivamente alle riunioni settimanali del team di lavoro.** Garantiremo

tracciabilità documentale e facilità di scambio con gli strumenti servizio e-cloud, Web Repository e FTP. Per garantire un **confronto costante** durante il periodo di esecuzione del servizio garantiamo:

- 1. Resoconti giornalieri e settimanali** con il R.U.P. dal vivo o tramite videoconferenza con Cisco Webex/Google MEET/Skype e gruppo WhatsApp;
- 2. Incontri intermedi** con gli stakeholders per verificare lo stato di avanzamento del progetto. Grazie all'esperienza maturata negli anni, proponiamo alcune strategie da noi utilizzate:

- Prevediamo, in una fase iniziale, di raggiungere degli accordi tra RUP e impresa esecutrice sulle scadenze e importi dei S.A.L., per garantire una liquidità continua all'impresa sulla base dell'evoluzione delle lavorazioni; questo sarà utile per gestire il rapporto con i subappaltatori ed evitare criticità realizzative;
- Ci accorderemo con RUP e impresa esecutrice sul cronoprogramma di emissione dei S.A.L. stabilito in relazione ai diversi momenti di rea-

lizzazione. Questo consente di monitorare facilmente i pagamenti ed evitare contenziosi amministrativi.

- **Monitoraggio dei tempi:** consapevoli dell'importanza delle tempistiche, garantiamo un monitoraggio costante delle lavorazioni tramite visite in cantiere periodiche e redazione dei verbali.

- **Contabilità puntuale:** durante le visite in cantiere i nostri Site Manager terranno aggiornato il Libretto delle Misure. Individueremo un professionista, esperto computista, che si occuperà dell'implementazione del modello BIM, in modo che il computo delle quantità e i costi siano sempre aggiornati in funzione dell'avanzamento delle lavorazioni, grazie all'uso del software ArchVision Rp e ACCAPrimus.

Attraverso l'impiego di **Primus Platform** potremo gestire la Direzione Lavori in modo efficace e veloce, collaborando in tempo reale su un'unica piattaforma con l'impresa, il RUP e tutti i portatori di interesse coinvolti nella realizzazione della nuova scuola media di Panzocchi di Ozzano.

Costanza ed efficacia delle attività di supervisione e controllo - Il cronoprogramma verrà costantemente aggiornato dai Direttori Operativi tramite la componente 4D, disponibile nel software BIM. Il Direttore dei Lavori arch. Rionda si occuperà in prima persona di **coordinare eventuali integrazioni documentali**

al progetto, utili alla definizione di criticità tecniche, e di raccogliere, verificare ed eventualmente **aggiornare la documentazione relativa al progetto edile, strutturale e impiantistico.** La documentazione, sempre aggiornata, verrà raccolta su server FTP condiviso con la Stazione Appaltante, e predisposta dal nostro back office, un ufficio appositamente dedicato all'aggiornamento della documentazione amministrativa e contabile di cantiere.

La contabilità sarà realizzata in modo da potersi interfacciare facilmente con il RUP e con l'appaltatore per la condivisione dei dati. Questo ci permette di rilevare l'efficienza dell'appaltatore. Inoltre, per garantire massima efficienza, il nostro metodo di lavoro prevede che la data di emissione del SAL venga formalmente comunicata al RUP con un anticipo di 10 giorni.

Le verifiche in cantiere saranno sia a campione che programmate e comprenderanno, ad esempio:

- 1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA** dei certificati di qualità dei materiali e elementi strutturali;
- 2. PROVE DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO** e prelievi di campioni secondo le specifiche UNI e D.M. 14.01.2008.

in questa occasione verranno anche trasmessi i documenti contabili aggiornati e il report fotografico delle

lavorazioni effettuate durante le visite di cantiere, di modo che l'ufficio tecnico della Stazione Appaltante possa valutare preventivamente l'effettiva messa in opera delle lavorazioni contabilizzate e snellire così le operazioni di richiesta finanziaria e di emissione del mandato di pagamento.

Procedure di controllo qualità - Nella fase della posa in opera i **controlli sistematici** in cantiere permetteranno di **individuare le modalità di realizzazione delle lavorazioni in opera.**

Verifica dei materiali in cantiere
Per la verifica dei materiali in cantiere la D.L. produrrà:

- 1. Scheda di approvazione materiale** contenente la provenienza del materiale, la ditta produttrice, le caratteristiche tecniche e dimensionali, la certificazione CE e EPD;
- 2. Scheda di posa in opera del materiale:** per tutti i materiali si esplicita una scheda di posa in opera in cui si indica se la posa sarà a carico dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 3. Presentazione delle campionate:** per i materiali più importanti dedicati alla realizzazione dell'opera, la DL chiederà all'appaltatore **almeno n. 3 campioni del materiale in oggetto,** per la resa del manufatto edilizio.

in questa occasione verranno anche trasmessi i documenti contabili aggiornati e il report fotografico delle

Sub-Criterio C4 Direzione lavori: efficacia ed efficienza delle modalità di informazione, interazione ed integrazione con la Stazione Appaltante

Pensiamo che per ottenere un progetto che risponda alle esigenze della Stazione Appaltante sia necessaria una comunicazione efficace. Per questo garantiamo:

Comunicazione con RUP, CSE e altri attori: Tutta la documentazione verrà richiesta volta per volta all'impresa e caricata sulla piattaforma elettronica PriMus Platform. Costituirà quindi, un mezzo di scambio tra il RUP, CSE e l'ufficio di DL. Tutto il materiale viene scaricato su FTP con protocollo di sicurezza elevato.

Comunicazione con l'appaltatore: La relazione tra DL e impresa avverrà tramite comunicazione informale, seguita da immediata comunicazione scritta formale controfirmata dall'impresa entro 5 giorni. Tutte le comunicazioni verranno caricate sulla piattaforma PriMus Platform cosicché tutti i potranno visualizzarle.

Tavoli tecnici di coordinamento: Attiviamo tavoli tecnici di coordinamento settimanalmente per valutare l'andamento del cantiere, consentendoci di evitare problemi che insorgono quando gli attori coinvolti lavorano a compartimenti stagni.

Resoconti giornalieri e settimanali con il R.U.P. dal vivo o tramite videoconferenza con Cisco Webex/Google MEET/Skype e gruppo WhatsApp;

Sub-Criterio C5 Direzione lavori: capacità di aggiornamento costante degli elaborati di progetto attraverso Building Information Modeling e consegna di elaborati aggiornati secondo cronoprogramma da definirsi con la Stazione Appaltante

Rapidità e qualità progettuale grazie al BIM

Il nostro RTP utilizza i più recenti software informatici al fine di sviluppare in maniera integrata e ottimizzata il progetto, con l'obiettivo di garantire un servizio approfondito, altamente ingegnerizzato, nel rispetto dei tempi e dei costi.

R Grazie all'utilizzo del software Autodesk Revit, svilupperemo un unico modello tridimensionale federato di livello 3 contenente la totalità dei dati tecnici. Utilizzeremo inoltre l'applicativo **RAN** Autodesk Navisworks per l'operazione di Clash detection.

L'approccio BIM faciliterà lo sviluppo del progetto, il passaggio dalle varie scale di progetto, e ne ridurrà i tempi di esecuzione e i costi legati. Tutto ciò che permette di svolgere il coordinamento 3D tra i diversi livelli di progettazione sarà modellato nel Level of Detail LOD 300 e LOD E, che permette di condurre tutte le analisi in maniera accurata come le analisi dei carichi termici, le simulazioni strutturali e di involucro edilizio.

Utilizziamo il plug-in autodesk per revit "BIM - collab - bcf" per inviare tra i membri del gruppo di lavoro annotazioni su es. Interferenze, con link a viste dal modello e annotazioni, zoom ecc.

Restituzione degli AS BUILT sul modello BIM - Il nostro ufficio di DL, qualora la Stazione Appaltante lo richiedesse, ha le competenze tecniche e dotazione strumentale per restituire gli As Built sul modello BIM. Ci coordineremo con l'impresa esecutrice dei lavori. Rileveremo le modifiche e migliori progettuali concordate in corso d'opera e le diffonderemo tra progetto esecutivo e realizzazione.

I disegni finali AS BUILT andranno a costituire l'archivio del progetto. Inoltre, ottenere un modello BIM finale corrispondente all'edificio costruito, è utile per la corretta programmazione delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di gestione.

Tali documenti saranno redatti dal nostro ufficio Direzione Lavori e verranno controfirmati dal Direttore Lavori arch. Elena Rionda: Durante le fasi finali di collaudo metteremo a servizio del RUP tutta la documentazione relativa al progetto su piattaforma CLOUD Dropbox e Google Drive per un rapido accesso alla documentazione aggiornata spostata durante il servizio.

Adottiamo una metodologia di lavoro e strumenti efficaci per mantenere la documentazione di cantiere sempre aggiornata, in vista delle attività di collaudo.

Sub-Criterio C6 Eventuali prestazioni e servizi aggiuntivi.

Qualora risultassimo vincitori, metteremo a disposizione del comune di Mozzecane un pacchetto di prestazioni aggiuntive volte a migliorare l'assistenza durante tutto il percorso. I servizi offerti saranno:

- Un professionista esperto in progettazione degli spazi pedagogici per implementare il progetto esecutivo
- Un percorso di progettazione partecipata articolato in 3 incontri tra PE e DL
- Un pacchetto divulgativo del progetto articolato in 2 render, 1 modello fisico in scala e un video della durata di 1 minuto
- L'assistenza alla rendicontazione del progetto in fase esecutiva con la presenza di più finanziamenti attivi in contemporanea.
- La verifica attiva degli AS Built redatti dall'appaltatore
- il supporto attivo all'ufficio di collaudo per il collaudo in corso d'opera
- Un ufficio DL in grado di operare in ambiente BIM durante lo svolgimento del cantiere.

Grazie allo sviluppo dei progetti in ambiente BIM, abbiamo il pieno controllo dell'intervento



**Report della Procedura REDAZIONE
 PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE
 DEI LAVORI, COORDINAMENTO
 DELLA SICUREZZA IN FASE DI
 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
 PER LA REALIZZAZIONE
 DELLA NUOVA SCUOLA
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 n. 157054541 effettuata da
 Comune di Villafranca di Verona**

COMUNE DI MOZZECANE
 Via C.B. Brenzoni n°26
 37060 - MOZZECANE (Verona)

Elisa Modelleri

SETTANTA7 S.R.L.
 Corso Re Umberto, 13 - 10121 Torino
 amministratore@settanta7.com
 settanta7/srl@legalmail.it
 www.settanta7.com
 FIVN72396810017

Elisa Modelleri

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione Giudicatrice	7
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	24
Registro di controllo	39
Comunicazioni di Procedura	46
Verbali intermedi	50

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	quesiti_rev01.pdf
<i>Documento disattivato il</i>	05/08/2022 13:18:16
<i>Allegato</i>	Disciplinare di gara_compilato.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	progetto definitivo.rar

31080 - MOZZE - VME (AGIOUS)
AP. DT. VILFRANCA 17 38
COMUNE DI VILFRANCA

Allegato Bando_gara_compilato.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All_1_istanza_dich_integrative.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_2_DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Calcolo corrispettivi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01_com_ora_data.pdf

Documento Pubblicato

Allegato quesiti_rev02.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Det_119_22ago22.PDF

Documento Pubblicato

Allegato All_3_dich_requisiti.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	157054541
<i>Nome Procedura</i>	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice CIG</i>	9300614578
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1916312
<i>Num. Protocollo Ente</i>	6252
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.04.01.04.E08 - SEDE AZIENDA SANITARIA, DISTRETTO SANITARIO, AMBULATORI DI BASE. ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO FINO A 24 CLASSI, SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO FINO A 25 CLASSI.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Modenini Lisa
<i>Login</i>	user_264327
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Villafranca di Verona (00232070235)
<i>Indirizzo email</i>	contratti.comune.villafranca.vr@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0456335817
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 22 luglio 2022 9.18.36 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 12 agosto 2022 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	429.634,99000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	429.634,99000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDA-

Nome	Descrizione	Tecnico / Amministrativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
Domanda di partecipazione	Il concorrente deve compilare la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative redatte secondo il modello Allegato 1.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara.	Tecnico	Libero	Max: 80,00 Min: 45,00	Allegato	

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDA-

Nome	Descrizione	Tecnico / Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	ra. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	formativo	tecnico		
Dichiarazione di impegno	Allegare la "dichiarazione di impegno", con firma digitale del legale rappresentante e attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero	Allegato	

Composizione della Commissione Giudicatrice

<i>Presidente della Commissione:</i>	Lisa Modenini
<i>Commissario 1:</i>	Matteo Faustini
<i>Commissario 2:</i>	Amedeo Margotto

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA

TABELLA 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L.
<i>Login</i>	user_202983
<i>Indirizzo e-mail</i>	stpsrl19@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03858240363
<i>Indirizzo</i>	VIA PER CONCORDIA N. 30, 41037 MIRANDOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	053526978
<i>Ragione sociale</i>	EUTECNE s.r.l.
<i>Login</i>	user_83284
<i>Indirizzo e-mail</i>	eutecneing@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02723650541
<i>Indirizzo</i>	via A. Volta n. 88, 06135 PERUGIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	07532761
<i>Ragione sociale</i>	ViTre Studio srl
<i>Login</i>	user_115621
<i>Indirizzo e-mail</i>	vitrestudio@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03466370248
<i>Indirizzo</i>	www.vitrestudio.com, 36016 THIENE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0445362749
<i>Ragione sociale</i>	Team Project srl
<i>Login</i>	user_57975
<i>Indirizzo e-mail</i>	teamprojectsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02746590161
<i>Indirizzo</i>	via Libertà 5, 24012 BREMBILLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035691042
<i>Ragione sociale</i>	S.T.I. Engineering S.r.l.
<i>Login</i>	user_140299

<i>Indirizzo e-mail</i>	set - engineering@globalcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02118550306
<i>Indirizzo</i>	Via Rodeano, 48, 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0432941303
<i>Ragione sociale</i>	Settanta7 S.r.l.
<i>Login</i>	user_250629
<i>Indirizzo e-mail</i>	settanta7srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12396810017
<i>Indirizzo</i>	Corso Re Umberto n. 13, 10121 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0110463878

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1660297931451
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2096926
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7445
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Settanta7 S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costituendo R.T.P. Settanta7 - GPA (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Partita Iva</i>	01315880516
<i>Codice Fiscale</i>	CRDGNN52L17A710U
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdi 12 agosto 2022 11.52.11 CEST
<i>Offerta economica</i>	184.871,93620 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	CENTOOTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTUNO / 93620 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	184.871,93620 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	A1. Domanda e dichiarazioni integrative.pdf.p7m
	Dimensioni: 217 KB
	Firmatari: RIONDA ELENA; CARDINALE GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): KppesAnP++PXNMFaJXFOGw==

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata dal Comune di Villafranca di Verona

	<p>6b845b73266eaa3fb42105889bb662cf2f7fdb56</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 525a268e200e10c18fbeatd4a65a250-fl1daa766579d62b50e430fb6b04bf55af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>A. DOC AMM.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Nx+QFJCh2bO62HN5dFC7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1bb0040f8a821b7c336da3cd96b3926963a4ea32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 057045295801d81920175521c0f0114-5cfbb9973b4a5c15cb9c7fdd5eb062bf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>B. OFF TEC.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R72UzaCeefLfv+cL5V/yqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa66b90d3e159a7bab697834f54630c1c1cc6fa1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7039364cafedcfcabe4664cac2353f5-ffd3c83683ba4466be0c7c906a6e35cb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i></p>	<p>C. Documento non richiesto.pdf.p7m</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da **Comune** di Villafranca di Verona

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /ZVYLeLrr2ICamWN0EFBnA==
	Hash(SHA-1-Hex): 99f4d3fc9405542259ddf7baa13322a510abaca9
	Hash(SHA-256-Hex): 883efa351156725e2252d1abcee13b2-4a5837f3dcb58a46f1bdf2112d46eae2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1660297477753
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2096882
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7444
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.T.I. Engineering S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 12 agosto 2022 11.44.37 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)

In forma singola

Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

1 All 1 istanza dich integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Stefano Massarino

Hash(MD5-Base64): PQcpQreoVr5zeNk6Hle1xA==

Hash(SHA-1-Hex):
3e89145a21e6a616ce81f46bc6182509f7f04c97

Hash(SHA-256-Hex): 40f83af9c6f67a7b06d796a3f2a6fb4-c9c54edd553d77ce9cd9ae1cc83b06627

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA STL.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): O91MgWxYs5kabBzZdacQtw==

Hash(SHA-1-Hex):
0da5c3cb1be39d78a694a1f43864568473a02310

Hash(SHA-256-Hex): 010d3f4ec04842dfa53c6dfcd982661-78ce45a67f13bfa65e39fccb87177bda7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>BUSTA B TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MnFbmKDVbgIj43BdNG1zZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28b4c0cbade1fd6047563c7eb7951b2c9c9703ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 89ca89e08deeee95c58b73dcd78e6e8-ed429d3a4a3485923945be4d658ef328a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1660272621337
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2095883
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7443
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Team Project srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 12 agosto 2022 4.50.21 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Costi della sicurezza derivanti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_1_istanza_dich_integrative.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Roberto Marconi
	Hash(MD5-Base64): BtJQvsjurpR1tcmsGVma6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 2d8e5859884d0ad474d32e60094325c377b1942a
	Hash(SHA-256-Hex): 2cbb99dbeddccdf2137b700789f81e8-b194b6547eceb9757efd3a847e06c5315
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	A - Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effittuato da Comune di Villfranca di Verona

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4ec5d34837efaa5c9edf02eddd804677132c5a47</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5321a8d33e9f354e0f8f4cd6ba5ac2d-b4e1c08e58168ce93da8e08f8812fa24a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>B - Offerta tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mgW2PJumR8IRWzRhOvzxGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 119e52cb759314dfa80b856725bf5ff8f106a97c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc2df5cbf7a27918a5cb8c10008c508-837875ea6589cd34ce9bb15d1998ab1b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Offerta anomala?</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Id Offerta</i>	<p>1660224670439</p>
<i>Num. Protocollo Interno</i>	<p>2092411</p>
<i>Num. Protocollo Ente</i>	<p>7442</p>
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	<p>Non protocollata</p>
<i>Num. Procedura Ente</i>	<p>Numero di Procedura assente</p>
<i>Fornitore</i>	<p>ViTre Studio srl</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Modello di partecipazione</i>		Forma Singola	
<i>Stato dell'Offerta</i>		Offerta Valida	
<i>Data</i>		giovedì 11 agosto 2022 15.31.10 CEST	
<i>Offerta economica</i>		372.000,00000 EUR	
<i>Offerta economica (in lettere)</i>		trecentosettantaduemila / 00000 EUR	
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>		0,00000 EUR	
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>		0,00000 EUR	
<i>Offerta economica complessiva</i>		372.000,00000 EUR	
<i>Parametri dell'Offerta</i>			
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>		Dichiaro di accettare termini e condizioni	
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>		Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali	
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>		In forma singola	
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>		I_All_1_istanza_dich_integrative_1_ViTre studio sr-l.pdf.p7m	
		Dimensioni: 557 KB	
		Firmatari: MUNARI MATTEO	
		Hash(MD5-Base64): U/D5hwQFuVU+L1cROY1BTw==	
		Hash(SHA-1-Hex): 83d119d0a255be91dc66e319606fd44e73e7f27a	
		Hash(SHA-256-Hex): 131a0c459676e7007bd1230475cc12f7a062f30b907091215c3fa4dc097454e4	

<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Busta amministrativa_ViTre studio srl.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): g71vgm0dh+gBfQ3yox/Feg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44e95f07dc5ab9fd2e23e0c6b95fb3b2dbe03e38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94bf326f27b685c345be5aa67fb7f2a-19096d88437b56f236de5cac191ede1e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Busta tecnica_ViTre studio srl.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M1PHJz2biZHlmqihzaIFtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b10ac8b63cb9a46d3a21942eee840805ad8b834d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea5aea305fec398db5cb557aa3c4d81-f07200cd8a01cee55f7de7c942ebf2576</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i></p>	<p>ViTre studio srl.pdf</p> <p>Dimensioni: 31 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wWolfBrgYWgru/wtY+vW+A==</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata dal Comune di Villafranca di Verona

	8f251098c08c0f4bcd6c59bb0a9a20249e5783c4
	Hash(SHA-256-Hex): 7e0117d72aa58c7472272d47452f7ea-ac738068ee4e0b0b49e1d9c91e8b9988e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1659958208995
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2071714
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7441
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EUTECNE s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP COSTITUENDO: EUTECNE s.r.l. (mandataria) - Arch. Carlo Bertolini (mandante) (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Arch. Carlo Bertolini
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 8 agosto 2022 13.30.08 CEST
<i>Offerta economica</i>	236.299,24000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DUECENTOTRENTASEIMILADUECENTONOVANTA-NOVE / 24000 EUR

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuato da Comune di Villafranca di Verona

<i>renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	236.299,24000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_1_istanza_dich_integrative_EUTECNE.pdf.p7m Dimensioni: 502 KB Firmatari: FRAPPI FEDERICO Hash(MD5-Base64): KR+k44vXzbk1WZSqzi1LjQ== Hash(SHA-1-Hex): b723e15b6560252ed4c0703f0f465bdfda5fc95b Hash(SHA-256-Hex): cd95c290ee4542b4cc900ccd5ac59a1-87ffcbf1ac80f14c72c2b8668f3461f37 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): K6WtP9DZLGPnR4z0gZA==</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): abec884cea43536c6c5d4629fa8bbd23fcc65f22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed53fed719df7dbf36aa0258f774942-f621e3ee935e37284db7663bbbd91affc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>BUSTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xDGDhDmOL5QbgrsQyO7ahg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2e0e1ebaed3a4e206877d3e785556641738d2116</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2365b680b508e4545b4f6e481562cc9-0fb17aa068a9f2227bf02d4308fd26925</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dich. impegno.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 587 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jJPz0PNC81gQsXWT40SW3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bcf648a6fa2b136ccf9ba8fa210c3975074e5586</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7d5a58ecf336bea8146a79bf0057b6-3a571952e7d075bcaacfd6bdd5a24f36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1659512591980
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2039421
<i>Num. Protocollo Ente</i>	7440
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	PER. IND. VERONESI ANDREA
<i>Partita Iva</i>	02485410365
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Tecnico Associato Lotti
<i>Partita Iva</i>	01735920207
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 3 agosto 2022 9.43.11 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)

RTI costituendo

Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

DOMANDA_RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI.7z

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): GcVphXsMckANOhhedYKwqA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf81de1959486bf43acfe72ec79227eac62b5f57

Hash(SHA-256-Hex): b93102c793b2eca9f37d14913fda72fb56b96df1a8fad6bf9fc7e472de8d8104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

REQUISITI_AMM_RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI-.7z

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): opw+ywj6JhztNT2RywJy+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f558542e50e8f4217f4c610266006fec05735128

Hash(SHA-256-Hex): b6cbdcc93d1b980dbe77fc5fbc5a5bd2c8d542d4b7dddc53d80f7947e52bcf43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	B TECNICA RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI.pdf- .p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Fa3cR0iZY17Hr6CTuUXngA= Hash(SHA-1-Hex): ef887e549758ec2f66a8a4b3e169385e26d96228 Hash(SHA-256-Hex): e04e6eb368b05a76fe477f41865b608-12470c0e20a8a6c52a887a8436d6085d3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1660297931451
<i>Fornitore</i>	Settanta7 S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Costituendo R.T.P. Settanta7 - GPA (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	GPA S.r.l.
<i>Partita Iva</i>	01315880516
<i>Codice Fiscale</i>	CRDGNN52L17A710U

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Data</i>	venerdi 12 agosto 2022 11.52.11 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	184.871,93620 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	CENTOOTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTUNO / 93620 EUR
<i>Punteggio economico</i>	20,00
<i>Punteggio tecnico</i>	52,33
<i>Punteggio totale</i>	72,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	A1. Domanda e dichiarazioni integrative.pdf.p7m
	Dimensioni: 217 KB
	Firmatari: RIONDA ELENA; CARDINALE GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): KppesAnP++PXNMFaJXFOGw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6b845b73266eaa3fb42105889bb662cf2f7fdb56
	Hash(SHA-256-Hex): 525a268e200e10c18fbaefd4a65a250-f1daa766579d62b50e430fb6b04bf55af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata dal Comune di Villafranca di Verona

<p>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Nx+QFJICH2bO62HN5dFC7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1bb0040f8a821b7c336da3cd96b3926963a4ea32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 057045295801d81920175521c0f0114-5cfbb9973b4a5c15cb9c7fdd5eb062bf5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</p>	<p>B. OFF TEC.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R72UzaCeefLfv+cL5V/yqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa66b90d3e159a7bab697834f54630c1c1cc6fa1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7039364cafedcfcabe4664cac2353f5-ffd3c83683ba4466be0c7c906a6e35cb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Punteggio proposto</p>	<p>-</p>
<p>Punteggio assegnato</p>	<p>52,33</p>
<p>Punteggio massimo</p>	<p>80,00</p>
<p>Commento Valutazione</p>	<p>L'offerta tecnica è ammessa in quanto supera la soglia di sbarramento</p>
<p>Punteggio tecnico</p>	<p>52,33</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

C. Documento non richiesto.pdf.p7m

Dimensioni: 49 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ZVYLeLrr2lCamWN0EFBnA==

Hash(SHA-1-Hex):
99f4d3fc9405542259ddf7baa13322a510abaca9

Hash(SHA-256-Hex): 883efa351156725e2252d1abcee13b2-4a5837f3dcb58a46f1bdf2112d46eae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1660297477753

Fornitore

S.T.I. Engineering S.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell'Offerta

Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data

venerdi 12 agosto 2022 11.44.37 CEST

Offerta economica

Informazione riservata

Punteggio economico

Informazione riservata

Punteggio tecnico

21,13

Punteggio totale

Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDA-

RIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<p><i>contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>tratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>In forma singola</p>
<p><i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>1 All 1 istanza dich integrative.pdf.p7m</p>
<p></p>	<p>Dimensioni: 653 KB</p> <p>Firmatari: Stefano Massarino</p> <p>Hash(MD5-Base64): PQcpQreoVr5zeNk6Hle1xA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e89145a21e6a616ce81f46bc6182509f7f04c97</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 40f83af9c6f67a7b06d796a3f2a6fb4-c9c54edd553d77ce9cd9ae1cc83b06627</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOC AMMINISTRATIVA STL.zip</p>
<p></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): O91MgWxYs5kabBzZdacQtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0da5c3cb1be39d78a694a1f43864568473a02310</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 010d3f4ec04842dfa53c6dfcd982661-78ce45a67f13bfa65e39fccb87177bda7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>BUSTA B TECNICA.zip</p>
<p></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

	<p>Hash(MD5-Base64): MnFbmKDVbgIj43BdNG1zZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28b4c0cbade1fd6047563c7eb7951b2c9c9703ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 89ca89e08deeee95c58b73dcd78e6e8-ed429d3a4a3485923945be4d658ef328a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	21,13
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	L'offerta tecnica è inferiore alla soglia di sbarramento di 45/80.
<i>Punteggio tecnico</i>	21,13
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1660272621337
<i>Fornitore</i>	Team Project srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 12 agosto 2022 4.50.21 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	21,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)

In forma singola

Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

All_1_istanza_dich_integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Roberto Marconi

Hash(MD5-Base64): BtJQvsjurpR1tcmsGVma6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8e5859884d0ad474d32e60094325c377b1942a

Hash(SHA-256-Hex): 2cbb99dbeddccdf2137b700789f81e8-b194b6547eceb9757efd3a847e06c5315

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

A - Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PVgTVukNG0wB/oVSMBgRTw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec5d34837efaa5c9edf02eddd804677132c5a47

Hash(SHA-256-Hex): 5321a8d33e9f354e0f8f4cd6ba5ac2d-b4e1c08e58168ce93da8e08f8812fa24a

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p> <p>B - Offerta tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): mgW2PJumR8IRWzRhOvzxGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 119e52cb759314dfa80b856725bf5ff8f106a97c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc2df5cbf7a27918a5cb8c10008c508-837875ea6589cd34ce9bb15d1998ab1b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Punteggio proposto</i></p> <p>-</p> <p><i>Punteggio assegnato</i></p> <p>21,53</p> <p><i>Punteggio massimo</i></p> <p>80,00</p> <p><i>Commento Valutazione</i></p> <p>L'offerta tecnica è inferiore alla soglia di sbarramento di 45/80.</p> <p><i>Punteggio tecnico</i></p> <p>21,53</p> <p><i>Punteggio economico</i></p> <p>- **</p> <p><i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i></p> <p>Informazione riservata</p>
<i>Id Offerta</i>	1660224670439
<i>Fornitore</i>	ViTre Studio srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	372.000,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	trecentosettantaduemila / 00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	9,94
<i>Punteggio tecnico</i>	60,13
<i>Punteggio totale</i>	70,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1_All_1_istanza_dich_integrative_1_ViTre studio srl.pdf.p7m Dimensioni: 557 KB Firmatari: MUNARI MATTEO Hash(MD5-Base64): U/D5hwQFuVU+L1cROY1BTw= Hash(SHA-1-Hex): 83d119d0a255be91dc66e319606fd44e73e7f27a Hash(SHA-256-Hex): 131a0c459676e7007bd1230475cc12f7a062f30b907091215c3fa4dc097454e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa_ViTre studio srl.zip

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): g71vgm0dh+gBfQ3yox/Feg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44e95f07dc5ab9fd2e23e0c6b95fb3b2dbe03e38</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94bf326f27b685c345be5aa67fb7f2a-19096d88437b56f236de5cac191ede1e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>Busta tecnica_ViTre studio srl.zip</p> <p>Dimensioni: 24 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M1PHJz2biZHImqihzaIFtg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b10ac8b63cb9a46d3a21942eee840805ad8b834d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea5aea305fec398db5cb557aa3c4d81-f07200cd8a01cee55f7de7c942ebf2576</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	60,13
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	L'offerta tecnica è ammessa in quanto supera la soglia di sbaramento
<i>Punteggio tecnico</i>	60,13
<i>Punteggio economico</i>	9,94

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	<p>ViTre studio srl.pdf</p> <p>Dimensioni: 31 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wWolfBrgYWgru/wtY+vW+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8f251098c08c0f4bcd6c59bb0a9a20249e5783c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e0117d72aa58c7472272d47452f7eac738068ee4e0b0b49e1d9c91e8b9988e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1659958208995
<i>Fornitore</i>	EUTECNE s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP COSTITUENDO: EUTECNE s.r.l. (mandataria) - Arch. Carlo Bertolini (mandante) (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Arch. Carlo Bertolini
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 8 agosto 2022 13.30.08 CEST
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	236.299,24000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	DUECENTOTRENTASEIMILADUECENTONOVANTANOVE / 24000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	15,65

<i>Punteggio totale</i>	65,58
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_1_istanza_dich_integrative_EUTECNE.pdf.p7m
	Dimensioni: 502 KB
	Firmatari: FRAPPI FEDERICO
	Hash(MD5-Base64): KR+k44vXzbk1WZSqzi1LjQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b723e15b6560252ed4c0703f0f465bdfda5fc95b
	Hash(SHA-256-Hex): cd95c290ee4542b4cc90ccd5ac59a1-87ffcbf1ac80f14c72c2b8668f3461f37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): K6rbwPs9DZZGP4Nx4z0gZA==
	Hash(SHA-1-Hex): abec884cea43536c6c5d4629fa8bbd23fcc65f22

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata dal Comune di Villafranca di Verona

	f621e3ee935e37284db7663bbbd91affc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	BUSTA TECNICA.zip
	Dimensioni: 20 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xDGDhDmOL5QbgrsQyO7ahg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2e0e1ebaed3a4e206877d3e785556641738d2116
	Hash(SHA-256-Hex): 2365b680b508e4545b4f6e481562cc9-0fb17aa068a9f2227bf02d4308fd26925
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	49,93
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	L'offerta tecnica è ammessa in quanto supera la soglia di sbarramento
<i>Punteggio tecnico</i>	49,93
<i>Punteggio economico</i>	15,65
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	Dich. impegno.pdf.p7m
	Dimensioni: 587 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuato in Comune di Villafranca di Verona

	<p>Hash(SHA-1-Hex): bcf648a6fa2b136ccf9ba8fa210c3975074e5586</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7d5a58ecf336bea8146a79bf0057b6-3a571952e7d075bcaacdf6bdd5a24f36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1659512591980
<i>Fornitore</i>	STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	PER. IND. VERONESI ANDREA
<i>Partita Iva</i>	02485410365
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Tecnico Associato Lotti
<i>Partita Iva</i>	01735920207
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	mercoledì 3 agosto 2022 9.43.11 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	26,6
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

<p><i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI costituendo</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOMANDA RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI.7z</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): GcVphXsMckANOhhedYKwqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf81de1959486bf43acfe72ec79227eac62b5f57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b93102c793b2eca9f37d14913fda72fb56b96df1a8fad6bf9fc7e472de8d8104</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>REQUISITI AMM RTP VERTICALE COSTITUENDO PELLICIARI-.7z</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): opw+tywj6JhztNT2RywJy+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f558542e50e8f4217f4c610266006fec05735128</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6cbdcc93d1b980dbe77fc5fbc5a5bd2c8d542d4b7dddc53d80f7947e52bcf43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	PELLICIARI.pdf- .p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Fa3cR0iZY17Hr6CTuUXngA== Hash(SHA-1-Hex): ef887e549758ec2f66a8a4b3e169385e26d96228 Hash(SHA-256-Hex): e04e6eb368b05a76fe477f41865b608-12470c0e20a8a6c52a887a8436d6085d3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	26,60
<i>Punteggio massimo</i>	80,00
<i>Commento Valutazione</i>	L'offerta tecnica è inferiore alla soglia di sbarramento di 45/80.
<i>Punteggio tecnico</i>	26,6
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 6 settembre 2022 15.27.55 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541, effettuata da Comune di Villafranca di Verona

Data	Oggetto	Peso
		lia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 64,00 Soglia punteggio economico: 16,00.
martedì 6 settembre 2022 15.27.55 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è iniziata.
martedì 6 settembre 2022 15.27.40 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è iniziata.
martedì 6 settembre 2022 15.22.10 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata completata.
martedì 6 settembre 2022 15.22.10 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1660297931451) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA

Data	Oggetto	Procedura
martedì 6 settembre 2022 15.22.10 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1660297477753) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata esclusa con la seguente motivazione: .
martedì 6 settembre 2022 15.22.10 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1660272621337) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata esclusa con la seguente motivazione: .
martedì 6 settembre 2022 15.22.10 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1660224670439) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 6 settembre 2022 15.22.09 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659958208995) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafraanca di Verona

Data	Evento	Descrizione
martedì 6 settembre 2022 15.22.09 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1659512591980) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata esclusa con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 14.25.44 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è iniziata.
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1660297931451) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1660297477753) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541

Data	Oggetto	Luogo
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1660272621337) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1660224670439) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659958208995) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 14.18.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659512591980) della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541, effettuata da Comune di Villafraanca di Verona

Data	Oggetto	Descrizione
		accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_140299 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_57975 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_250629 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_115621 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_83284 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 agosto 2022 9.46.47 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_202983 sulla Procedura con ID 157054541 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 22 agosto 2022 10.37.01 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157054541
venerdì 19 agosto 2022 13.40.00 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157054541
venerdì 12 agosto 2022 12.00.13 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
venerdì 12 agosto 2022 11.52.11 CEST	Invio Offerta	L'offerente Settanta7 S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIRE-

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541, effettuata da Comune di Villafraanca di Verona

Data	Oggetto	Prezzo
		ZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
venerdì 12 agosto 2022 11.44.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.T.I. Engineering S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
venerdì 12 agosto 2022 4.50.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente Team Project srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
giovedì 11 agosto 2022 15.31.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente ViTre Studio srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
lunedì 8 agosto 2022 13.30.08 CEST	Invio Offerta	L'offerente EUTECNE s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541, effettuata da Comune di Villafranca di Verona

Data	Oggetto	Contenuto
		FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
venerdì 5 agosto 2022 13.19.31 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157054541
mercoledì 3 agosto 2022 9.43.11 CEST	Invio Offerta	L'offerente STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541).
venerdì 22 luglio 2022 9.18.37 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. (ID 157054541). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	157490036
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 luglio 2022 16.10.21 CEST
<i>Mittente</i>	EUTECNE s.r.l. (EUTECNE s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDA-

<p>RIA DI PRIMO GRADO n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona</p>	<p>Con la presente si chiede il seguente chiarimento: - in riferimento al criterio b. dell'offerta tecnica, si chiede conferma che nel caso di servizi svolti in RTP debbano essere specificate le prestazioni effettivamente svolte dal concorrente per ogni categoria d'opera in cui è suddiviso il servizio svolto con specificate le relative quote percentuali di esecuzione; - relativamente al criterio c. dell'offerta tecnica si chiede conferma che il cronoprogramma, i curricula e i certificati di cui alla pag 32 del disciplinare sono esclusi dal conteggio delle pagine previste per tale sub-criterio. Si rileva inoltre alla lettera B. pag. 36 del disciplinare di gara, un'incongruenza tra la specifica che "i servizi potranno essere individuati anche tra quelli non strettamente afferenti ad edifici ad uso scolastico" e il corretto richiamo, sempre all'interno dello stesso paragrafo, alle Linee Guida n.1 di attuazione del Codice approvate dall' ANAC secondo cui "i servizi devono essere affini per tipologia, classe, categoria [...]". Si chiede pertanto conferma che i 3 servizi richiesti devono essere relativi a edifici ad uso scolastico.</p>
<i>Id Messaggio</i>	157948968
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 agosto 2022 16.53.54 CEST
<i>Mittente</i>	S.T.I. Engineering S.r.l. (S.T.I. Engineering S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento 3
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione e prima dell'avvio della progettazione esecutiva, venga consegnato il modello del progetto definitivo. Se sì si chiede se venga consegnato in formato nativo. Cordialmente, STI Engineering</p>
<i>Id Messaggio</i>	158158802
<i>Data di invio</i>	venerdì 12 agosto 2022 9.55.36 CEST
<i>Mittente</i>	Team Project srl (Team Project srl)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invio garanzia provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, con la presente si integra l'offerta già inserita nella procedura telematica con la richiesta garanzia provvisoria. Distinti saluti, TEAM PROJECT srl.</p>
<i>Allegato</i>	<p>Garanzia provvisoria.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuato dal Comune di Villafranca di Verona

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5912dea8d59f736ff22c62c7753bab1617a034c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c428785baa380326394a16d97c438e0-7f2c10177f37402b81407b08b12ec1721</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	157947432
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 agosto 2022 16.27.12 CEST
<i>Mittente</i>	S.T.I. Engineering S.r.l. (S.T.I. Engineering S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si chiede conferma dei seguenti punti: • Con riferimento ai 30 giorni dedicati alla progettazione esecutiva, gli affinamenti e commenti del Committente (con i contenuti necessari alla conclusione positiva del processo di verifica e validazione del progetto) sono successivi a questo periodo? • Esiste un maggiore dettaglio sulla tempistica prevista per la procedura di affidamento dei lavori? Infatti sarebbe opportuno sapere se state considerando una tempistica precisa (n.xx di giorni) • Conferma che il cantiere possa avere le durata presunta di 1 anno (come esplicitato nel progetto definitivo); • Il programma del cantiere sarà oggetto della progettazione esecutiva e non è richiesto per la gara in oggetto; • La consegna degli "as-built" completati sarà con un leggero sfasamento rispetto alla fine dei lavori. Saluti, STI Engineering Srl
<i>Id Messaggio</i>	157910709
<i>Data di invio</i>	giovedì 4 agosto 2022 8.19.23 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Villafranca di Verona (Modenini Lisa)
<i>Destinatari</i>	S.T.I. Engineering S.r.l. (S.T.I. Engineering S.r.l.), ricevuto in data giovedì 4 agosto 2022 15.15.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimento 1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alla richiesta di chiarimenti si invita a consultare il documento "quesiti" caricato nella documentazione di gara. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito: il cronoprogramma richiesto nell'ambito

Report della Procedura REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDA-

RIA DI PRIMO GRADO. n. 157054541 effettuata da Comune di Villafranca di Verona

	che metodologiche" dell'offerta rientra nel conteggio delle max. 4 pagine A4 o lo stesso può essere consegnato quale allegato in aggiunta alle 4 pagine? Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro. Cordiali Saluti, STI engineering Srl
<i>Id Messaggio</i>	157893437
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 agosto 2022 16.33.54 CEST
<i>Mittente</i>	S.T.I. Engineering S.r.l. (S.T.I. Engineering S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento 1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito: il cronoprogramma richiesto nell'ambito della relazione metodologica riferita al criterio "Caratteristiche metodologiche" dell'offerta rientra nel conteggio delle max. 4 pagine A4 o lo stesso può essere consegnato quale allegato in aggiunta alle 4 pagine? Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro. Cordiali Saluti, STI engineering Srl
<i>Id Messaggio</i>	157670933
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 luglio 2022 18.09.57 CEST
<i>Mittente</i>	Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Modenini Lisa (Modenini Lisa), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente, in riferimento all'art. 6.3, del Disciplinare di Gara si chiede: - se, relativamente alle ID E.08 ed S.03, venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che «Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...] Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture"; - se, relativamente all'ID IA.03, possano essere utilizzati servizi relativi all'ID IA.04; - se, relativamente ai servizi di punta di cui alla lett. i), gli stessi debbano riguardare contemporaneamente sia la progettazione esecutiva che il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che la direzione lavori oppure è sufficiente che riguardino uno qualsiasi di questi servizi. Con l'occasione si segnala inoltre che il CIG non risulta perfezionato. Grazie. Distinti saluti.

Verballi intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 6 settembre 2022 15.51.33 CEST
<i>Commento</i>	alla fine della seduta 3 si crea report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2362593
<i>Data</i>	mercoledì 24 agosto 2022 14.20.43 CEST
<i>Commento</i>	Al termine della prima seduta pubblica si genera report intermedio di procedura
<i>Numero di protocollo interno</i>	2153203
